IRISGARRITASUN PLANAREN 2. ALDAKETA

2ª MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

2014ko abendua - Diciembre 2014





3. BOLUMENA (I) / VOLUMEN 3 (I)

BIDE PUBLIKOAREN JARDUKETA PLANA PLAN DE ACTUACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA

Memoria eta Gune Libreen azterketa Memoria e informes de Zonas Libres

2. liburua / libro 2

Arkitektoak Arquitectos

3. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA

ÍNDICE DEL VOLUMEN

- 1. PRESENTACIÓN
- 2. AMBITO DE ACTUACION
- 3. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
- 4. TIPOLOGÍAS DE ELEMENTOS URBANOS
 - 4.1. Alcorques
 - 4.2. Bancos
 - 4.3. Bocas de riego
 - 4.4. Bolardos
 - 4.5. Jardineras
 - 4.6. Fuentes
 - 4.7. Papeleras
- 5. CRITERIOS DE PRIORIZACION
- 6. PROPUESTA DE INTERVENCION
- 7. PLAN DE ETAPAS
- 8. PRESUPUESTO ESTIMATIVO

ANEXO: INFORMES DE CALLES Y ZONAS LIBRES

1. PRESENTACIÓN

Para la realización del "Plan de Actuación en la Vía Pública" se ha tomado como referencia la misma sistemática de trabajo del "Plan de Accesibilidad del 2007; VOLUMEN 3: Plan de Actuación en la Vía Pública"; es decir, identificar y diagnosticar aquellas situaciones urbanas consideradas como barreras, para a continuación, aplicando los criterios de accesibilidad, proponer, describir y cuantificar económicamente las actuaciones necesarias para su eliminación y adaptación.

Los contenidos del presente **VOLUMEN** se centran en la propuesta de itinerarios por fases con un diagnóstico de las barreras y carencias encontradas, junto con las actuaciones necesarias con las pautas a seguir, acompañadas de una valoración económica de las mismas. El análisis detallado se desarrolla en el **ANEXO** correspondiente que por su amplitud se divide en distintos libros.

La sistemática utilizada en el ANEXO es la siguiente:

- Ámbito de actuación: Se delimita el ámbito urbano objeto de análisis en el presente documento. Para facilitar el manejo del documento el total del ámbito se divide en distintas ZONAS y algunas de estas en dos o tres SUBZONAS. Cada ZONA abarca una calle o grupo de calles para facilitar un más fácil acceso al documento para cualquiera que quiera consultarlo.
- Análisis de cada ZONA: El análisis de cada ZONA se recoge en la correspondiente FICHA. La primera hoja es de información y en la misma se delimita la ZONA con los distintos tramos y cruces que incluye. Se incorporan también fotografías para facilitar la localización de la calle o calles objeto de análisis.

La segunda hoja gráfica de la **FICHA**, (tercera si la información ha sido más extensa) contiene lo recogido en el Plan de Accesibilidad del 2007 representado sobre la topografía existente en la época en la que se redactó. En la siguiente hoja gráfica de la misma **FICHA** se representan con distintos símbolos sobre topografía actual las deficiencias advertidas en el Plan de 2007 que se encuentran ya subsanadas y las pendientes. La última hoja gráfica recoge las deficiencias no resueltas y las nuevas propuestas del documento.


 Se incluye en cada FICHA una breve memoria explicativa de las actuaciones realizadas y de las nuevas previstas. Se completa cada FICHA con una estimación económica del coste de las obras necesarias para la realizar las adaptaciones propuestas. Para ello, se toman como referencia los costos utilizados en el Plan de Accesibilidad del 2007 actualizados con una subida del 10%.

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN


Se mantiene básicamente el mismo ámbito del Plan de Accesibilidad del 2007.

Las distintas **ZONAS** en las que divide el ámbito general se recogen el las siguientes tablas. Los tramos y cruces se representan en los planos generales que se incluyen en el documento además de en las distintas **FICHAS**.


2.1 JARDUKETA EREMUA eta GUNE LIBREAK (Egungo azterketa) / AMBITO de ACTUACIÓN y ZONAS LIBRES (Análisis estado actual)

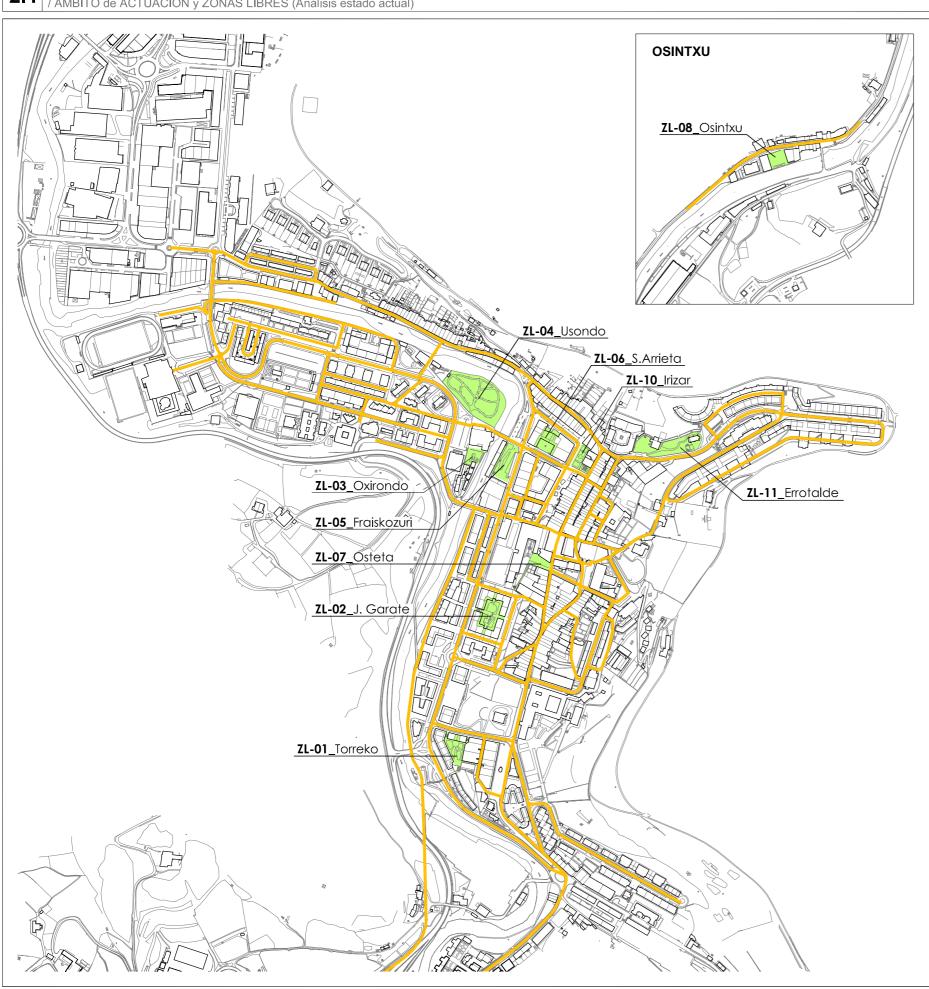


2.2 JARDUKETA EREMUA eta GUNE LIBREAK (Egungo azterketa) / AMBITO de ACTUACIÓN y ZONAS LIBRES (Análisis estado actual)

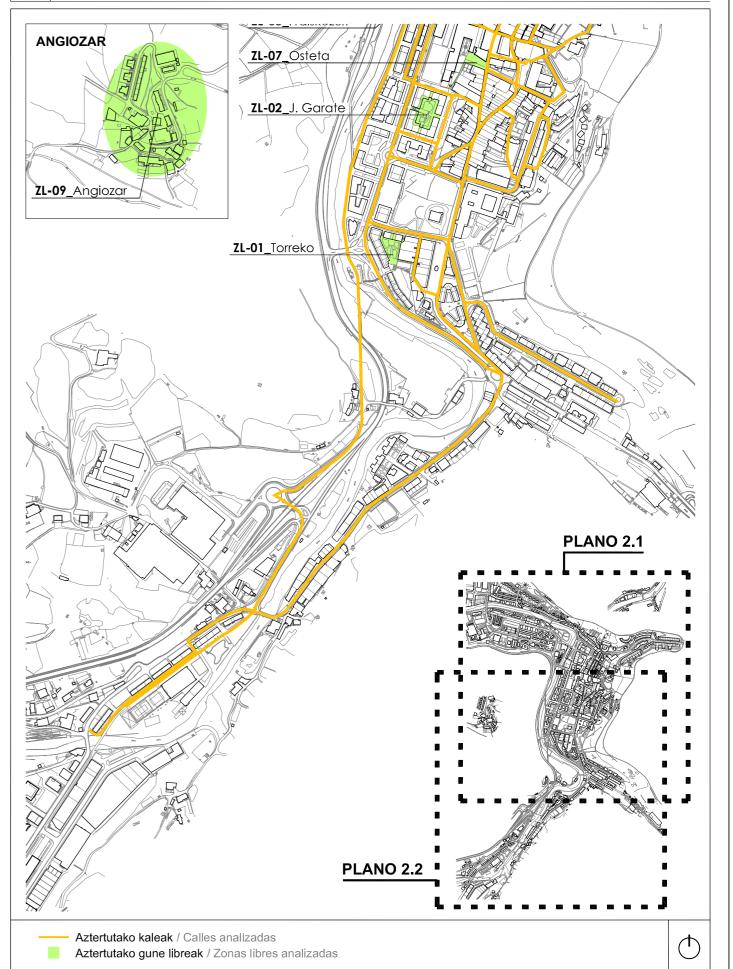

2.3 AZTERKETA EREMUEN MUGAKETA (Egungo azterketa)
/ DENOMINACION de ZONAS ANALIZADAS (Análisis Estado Actual)

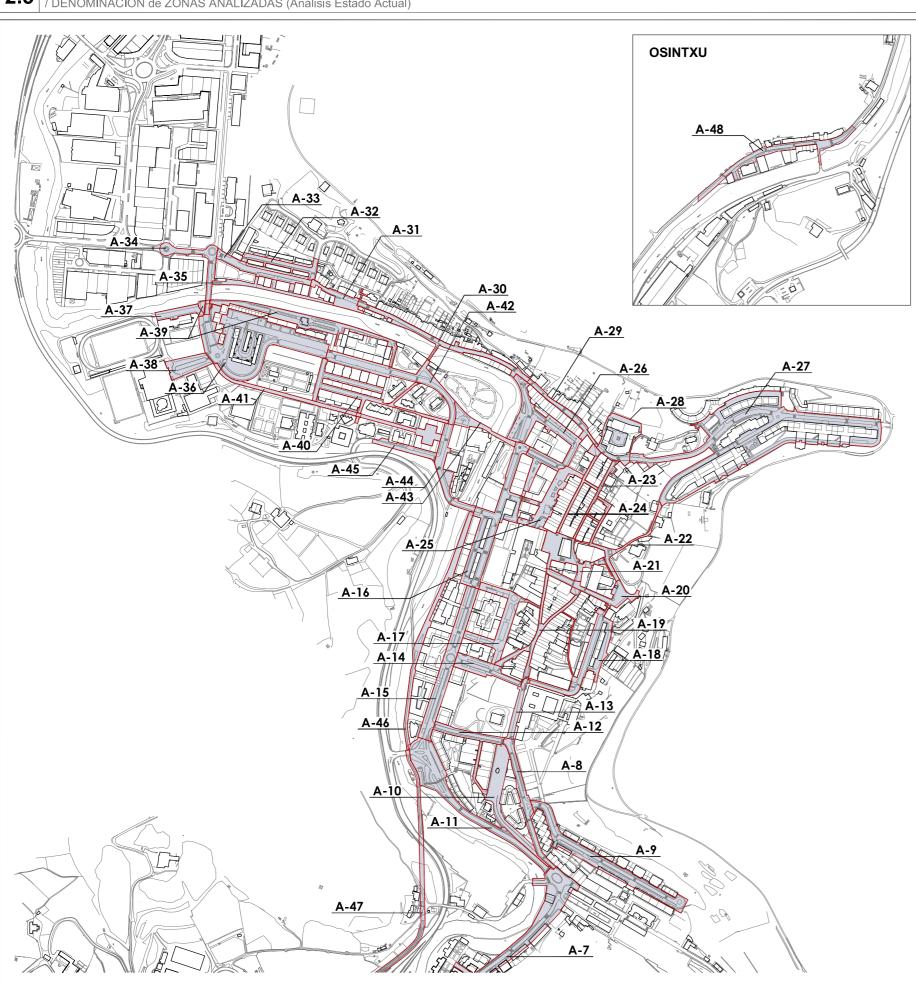

2.4 AZTERKETA EREMUEN MUGAKETA (Egungo azterketa) / DENOMINACION de ZONAS ANALIZADAS (Análisis Estado Actual)

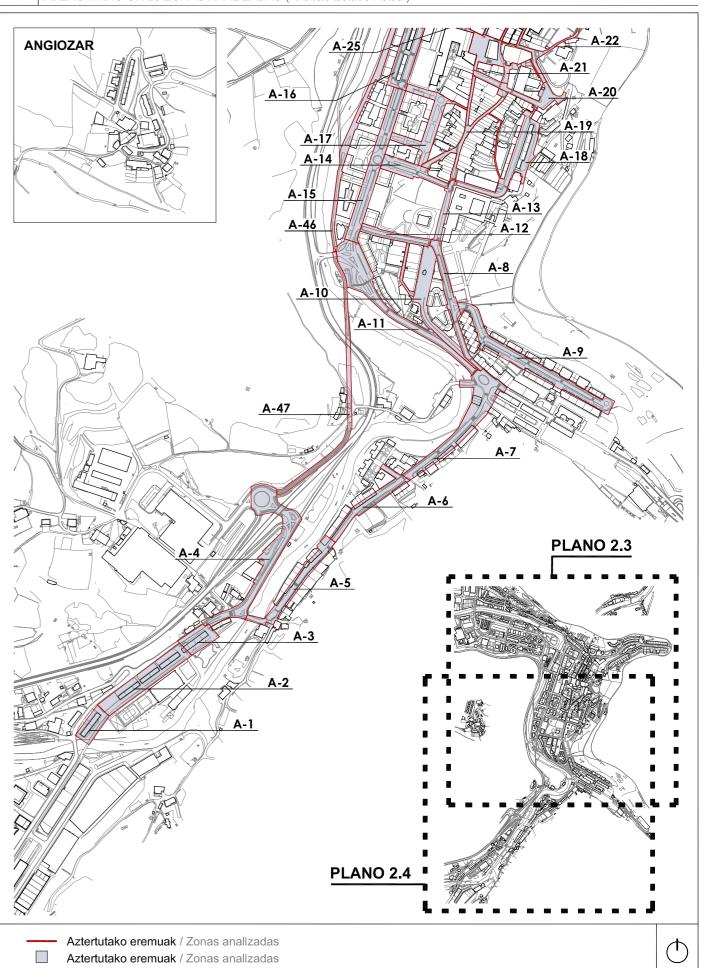

Denominación actual	Denominación del Plan de Accesibilidad del 2007	
Zona	Tramo - Cruce Nombre	
	TR-82	IBARRA
A-1	TR-86	LATERAL IBARRA, 15
IBARRA kalea	CR-62	IBARRA
	TR-79	IBARRA
	TR-80	IBARRA
	TR-81	IBARRA
	TR-83	LATERAL IBARRA, 1
A-2	TR-84	LATERAL IBARRA, 3
IBARRA kalea	TR-85	LATERAL IBARRA, 7
	CR-50	,
	CR-59	IBARRA
	CR-60	IBARRA
	CR-61	IBARRA
	TR-131	OZAETA
A-3	TR-132	LATERAL OZAETA,3
OZAETA kalea	TR-135	PASEO ANTIGUO FFCC
	CR-63	IBARRA
	TR-129	OZAETA
A 4	TR-130	OZAETA
A-4	CR-49	OZAETA
OZAETA kalea	CR-63	OZAETA
	CR-98	OZAETA
	TR-133	OZAETAKO ZUBIA
A-5	TR-163	ZUBIAURRE
ZUBIAURRE kalea	CR-57	ZUBIAURRE
	CR-58	ZUBIAURRE
A C	TR-107	MARTOKO
A-6 MARTOKO kalea	TR-108	MARTOKO AUZOA
WARTONO kalea	CR-56	MARTOKO
	TR-56	GAVIRIA
A-7	TR-144	SAN ANTONIO
SAN ANTONIO kalea	TR-155	URTEAGA
	CR-44	ROTONDA SAN ANTONIO
	TR-117	MINTEGI
	TR-118	MINTEGI
A-8	TR-154	URTEAGA
MINTEGI kalea	CR-45	MINTEGI
	CR-47	MINTEGI
	CR-51	MINTEGI - ARTZAMENDI
	TR-20	ARTZAMENDI
A-9	TR-21	ARTZAMENDI
A-9 ARTZAMENDI kalea	TR-22	ESCALERAS ARTZAMENDI,8
ATTICAIVILINDI NAIGA	CR-51	ARTZAMENDI - MINTEGI
	CR-55	ARTZAMENDI
A-10	TR-52	ESPOLOIA
A-10 ESPOLOIA kalea	TR-53	ESPOLOIA
LOI OLOIA Kaiea	CR-88	ESPOLOIA

Denominación actual	Denominación del Plan de Accesibilidad del 2007		
Zona	Tramo - Cruce Nombre		
	TR-54	ESCALERAS ESPOLOIA	
	TR-76	IBARGARAI	
	TR-77	IBARGARAI	
A-11	TR-138	PUENTE ERTZAINTZA	
IBARGARAI kalea	CR-44	ROTONDA SAN ANTONIO	
	CR-48	NOTONE/NONNY ONIO	
	CR-89	IBARGARAI	
	TR-12	ARRIZURRI	
	TR-13	ARRIZURRI	
A-12	CR-46	ARRIZURRI - IBARGARAI	
ARRIZURI kalea	CR-47	ARRIZURRI - MINTEGI	
711 (1 (120) (1 Na) 64	CR-87	ARRIZURRI	
	TR-109	MARTZIAL AGIRRE	
-	TR-51	ESPOLOIA	
A-13	CR-36	ESPOLOIA - R. OIARZABAL	
ESPOLOIA kalea	CR-47	ESPOLOIA - MINTEGI	
	TR-91	IPARRAGIRRE	
A-14	*TR-168	ROMAN OIARZABAL	
ROMAN OIARZABAL,	CR-36	IPARRAGIRRE - ESPOLOIA	
RAMON Mª LILI ka-	CR-41	RAMON Ma LILI	
leak	CR-92	IPARRAGIRRE - IBARGARAI	
	TR-72	IBARGARAI	
	TR-73	IBARGARAI	
	TR-74	IBARGARAI	
A-15	TR-75	IBARGARAI	
IBARGARAI kalea	CR-22	IBARGARAI	
12) ii (6) ii 0 ii 1(a)6a	CR-46	IBARGARAI - ARRIZURI	
	CR-91	ID/III / II / II II / II II / II II / II II	
	CR-92	IBARGARAI - IPARRAGIRRE	
	TR-55	FRAISKOZURI	
	TR-61	HERRILAGUNAK	
	TR-62	HERRILAGUNAK	
	TR-63	HERRILAGUNAK	
	TR-70	IBARGARAI	
	TR-71	IBARGARAI	
A-16	TR-78	TRASERA IBARGARAI, 1	
FRAISKOZURI, ZURRA-	TR-153	T. ARANZADI	
DERO, HERRILAGUNAK,	TR-167	ZURRADERO	
IBARGARAI kaleak	CR-9	BIDEBERRI	
	CR-17	TRASERA IBARGARAI, 1	
	CR-18	FRAISKOZURI	
	CR-20	HERRILAGUNAK	
	CR-21	HERRILAGUNAK	
	CR-22	IBARGARAI - ZURRADERO	
	CR-23	HERRILAGUNAK	

Denominación actual	Denominación del Plan de Accesibilidad del 2007		
Zona	Tramo - Cruce Nombre		
20114	TR-26	BELANBIDE	
	TR-88	IKERLEKU	
	TR-89	IPARRAGIRRE	
A-17	TR-90	IPARRAGIRRE	
IPARRAGIRRE, BELAN-	CR-22	IBARGARAI	
BIDE, IKERLEKU kaleak	CR-34		
	CR-90		
	CR-91		
	TR-142	R. OIARZABAL	
	TR-156	ZABALOTEGI	
	TR-157	ZABALOTEGI	
	TR-158	ZABALOTEGI	
	TR-159	ACCESO UDAL EUSKALTEGIA	
1.40	TR-160	ACCESO UDAL EUSKALTEGIA	
A-18	TR-161	ESCALERAS A ZABALOTEGI, 2	
ZABALOTEGI kalea	TR-162	LATERAL DE ZABALOTEGI, 9	
	CR-36	R. OIARZABAL - ESPOLOIA	
	CR-37		
	CR-42	ZABALOTEGI	
	CR-43		
	CR-54	ZABALOTEGI	
	TR-30	BIDEKURUTZETA	
	TR-31	BIDEKURUTZETA	
	TR-32	BIDEKURUTZETA	
A 10	TR-33	BIDEKURUTZETA	
A-19 BIDEKURUTZETA, SAN	TR-143	RAMON Mª LILI	
PEDRO, RAMON Mª LILI	TR-150	SAN PEDRO	
kaleak	TR-151	SAN PEDRO	
	CR-31		
	CR-33		
	CR-35		
	CR-38	SAN PEDRO	
	TR-25	BASARTE	
	TR-97	JUAN IRAZABAL	
	TR-100	KOMENIO	
A-20	TR-105	MADALENA PLAZA	
MIZPILDI, KOMENIO ka-	TR-119	MIZPILDI	
leak, MADALENA plaza	TR-161	ESCALERAS A ZABALOTEGI, 2	
	CR-29 CR-30	MIZPILDI BIDEKURUTZETA	
	CR-30 CR-32	MIZPILDI	
	CR-52 CR-53		
	011-00		

Denominación actual	Denominación del Plan de Accesibilidad del 2007		
Zona	Tramo - Cruce Nombre		
Zona	TR-9	ARIZNOA	
	TR-10	ARIZNOA ARIZNOA	
	TR-10	BIDEKURUTZETA	
	_		
	TR-102	LAUDANTZ	
A-21	TR-147	SAN MARTIN AGIRRE	
SAN MARTIN AGIRRE.	TR-148	LATERAL AYUNTAMIENTO	
SAN PEDRO ARIZNOA	*TR-169	ARIZNOA	
plazak	CR-13	ARIZNOA	
	CR-29	MIZPILDI	
	CR-30	BIDEKURUTZETA	
	CR-40	ARIZNOA	
	CR-85		
	CR-86	BIDEKURUTZETA	
	TR-50	ERROMAGALARTZA	
A 22	TR-57	GOENKALEA	
A-22	TR-58	GOENKALEA	
GOENKALE, J.IRAZABAL,	TR-97	JUAN IRAZABAL	
K.ELEIZALDE kaleak,	TR-98	KOLDO ELEIZALDE	
LAUDANTZ, ERROMA-	TR-104		
GALARTZA kantoiak	CR-7		
	CR-14		
	CR-39		
	TR-14	ARRURIAGA	
	TR-17	ARTEKALEA	
A 22	TR-18	ARTEKALEA	
A-23 ARTEKALE, ARRURIAGA	TR-19	ARTEKALEA	
kaleak	CR-1	ARRURIAGA	
Kalcak	CR-3	ARRESE	
	CR-5		
	CR-6		
	TR-11	ARRESE	
A-24	TR-23	BARRENKALEA	
BARRENKALE y ARRE-	TR-24	BARRENKALEA	
SE kantoia	CR-2	BARRENKALEA	
	CR-4	BARRENKALEA	
	TR-43	D. IRALA	
	TR-44	D. IRALA	
	TR-59	HERRILAGUNAK	
	TR-60	HERRILAGUNAK	
A-25	TR-93	IRIZAR	
DOMINGO IRALA,	TR-152	T.ARANZADI	
HERRILAGUNAK, TE-	CR-4	BARRENKALEA	
LESFORO ARANZADI ka- leak; IRIZAR pasealekua	CR-8	D. IRALA	
ioan, ii lizait pascaichua	CR-15	D. IRALA	
	CR-17	TRASERA IBARGARAI, 1	
	CR-19		
	CR-20	HERRILAGUNAK	

Denominación actual	Denominación del Plan de Accesibilidad del 2007		
Zona	Tramo - Cruce Nombre		
	TR-27	BIDEBERRI	
	TR-28	BIDEBERRI	
	TR-45	D. IRALA	
	TR-94	IRIZAR	
	TR-95	IRIZAR	
A-26	TR-96	JOAN XXIII	
BIDEBERRI, IRIZAR,	TR-101	KRUZ GALLASTEGI	
KRUZ GALLASTEGI, JUAN XXIII kaleak	CR-8	D. IRALA	
JOAN AAIII Kaleak	CR-9	BIDEBER	
	CR-10	BIDEBERRI	
	CR-16		
	CR-28		
	CR-94		
	TR-6	ARANERREKA	
	TR-7	ARANERREKA	
	TR-8	ARANERREKA	
	TR-16	ARRURIAGA, 16	
	TR-34	BOLU	
A-27	TR-92	IRABURU	
BOLU, ARANERREKA, K.	TR-99	KOLDO ELEIZALDE	
ELEIZALDE kaleak	CR-12	ARANERREKA	
	CR-26	ARANERREKA	
	CR-27	IBARBURU	
	CR-93	IRIZAR	
	CR-97	JUAN IRAZABAL	
	TR-15	ARRURIAGA	
A-28	TR-110	MASTERREKA	
BURDIÑATE, MASTE-	*TR-170	MASTERREKA	
RREKA kaleak	CR-1	ARRURIAGA	
	CR-2	BARRENKALEA	
4.00	TR-111	MASTERREKA	
A-29	CR-2	BARRENKALEA	
MASTERREKA kalea	CR-28		
	TR-165	ZUBIETA	
A 20	TR-166	ZUBIETA	
A-30 ZUBIETA kalea	CR-28		
ZUDIE I A Kältä	CR-82	PUENTE ZUBIETA	
	CR-83		
A-31	TR-122	MUGERTZA	
MUGERTZA kalea	CR-79		
	CR-83		
	TR-106	MADURA	
	TR-120		
A-32	TR-121	MOIUA	
MOIUA, MADURA kaleak	CR-77	AMILLAGA	
IVIOIOA, IVIADUNA KAIBAK	CR-78	MADURA	
	CR-79		
	CR-80	MADURA	
-	-		

Denominación actual	Denominación del Plan de Accesibilidad del 2007		
Zona	Tramo - Cruce Nombre		
20114	TR-145	LEIZARIAKO SAN LORENZO	
A-33	TR-146	LEIZARIAKO SAN LORENZO	
A-33 LEIZARIAKO SAN LO-	CR-77	AMILLAGA	
RENTZO kalea			
NENTZO Kalea	CR-78	MADURA	
4.04	CR-79 TR-5	AMILLAGA	
A-34		PUENTE SANTALAITZ	
AMILLAGA, BONI LAS-	TR-139 CR-65		
KURAIN kaleak, SANTA- LAITZ zubia	CR-05 CR-77	BONI LASKURAIN AMILLAGA	
A-35	CR-11	AWILLAGA	
desde puente SANTA-			
LAITZ al aparcamiento	*TR-171	MUGERTZA	
MUGERTZA			
	TR-38	BONI LASKURAIN	
	TR-113	MATXIATEGI	
A-36	TR-114	MATXIATEGI	
BONI LASKURAIN,	TR-115	PASEO DE MATXIATEGI	
MATXIATEGI kaleak,	TR-116	MATXIATEGI, 15-33	
HILERRIA	CR-64	BONI LASKURAIN	
	CR-65	BONI LASKURAIN	
	CR-67	HILERRIA	
A-37 / A-38	TR-42	BONI LASKURAIN,25	
BONI LASKURAIN	TR-41	ACCESO PISCINAS AGORROSIN	
	TR-67	IBAIONDO	
	TR-68	IBAIONDO	
A-39	TR-69	IBAIONDO, 7	
IBAIONDO kalea	CR-65	BONI LASKURAIN	
	CR-70	E. URDANGARIN	
	CR-84		
	TR-01	A. FLEMING	
	TR-02	ALKABIETA	
	TR-03	ALKABIETA	
	TR-04	ALKABIETA	
	TR-39	ACCESO CENTRO SALUD	
	TR-49	E. URDANGARIN, 3	
A-40	TR-64	HILERRIA	
ALKABIETA, A. FLE-	TR-65	HILERRIA	
MING, BONI LASKURAIN	TR-66	HILERRIA	
kaleak, HILERRIA,	CR-67	HILERRIA	
	CR-68	A. FLEMING	
	CR-69		
	CR-72		
	CR-73	BONI LASKURAIN	
	CR-74	BONI LASKURAIN	
	CR-75		
	TR-35	BONI LASKURAIN	
	TR-36	BONI LASKURAIN	
A-41	TR-37	BONI LASKURAIN	
BONI LASKURAIN kalea	CR-64	BONI LASKURAIN	
	CR-73	BONI LASKURAIN	
	CR-74	BONI LASKURAIN	
	·		

Denominación actual	Denominación del Plan de Accesibilidad del 2007	
Zona	Tramo - Cruce	Nombre
	TR-35	BONI LASKURAIN
	TR-47	E. URDANGARIN
A-42	TR-48	E. URDANGARIN
MATXIATEGI,	TR-112	MATXIATEGI
E.URDANGARIN kalea	CR-67	HILERRIA
	CR-70	E. URDANGARIN
	CR-71	PUENTE ZUBIETA
A-43 SANTA MARINA zubia	TR-140	
	TR-46	E. URDANGARIN
A-44	TR-137	PUENTE DEL MATADERO
E.URDANGARIN kalea,	CR-24	
MATADERO zubia	CR-25 E. URDANGARIN	
	CR-76	
A-45	TR-149	SAN MARTZIAL
SAN MARTZIAL kalea	CR-25	E. URDANGARIN
A-46	TR-123	ORTUIBAR
ORTUIZA kalea	CR-24	
	CR-99	
A-47 AN-	TR-134	PASEO ANTIGUO FFCC
TIGUA FFCC	CR-98	OZAETA
	CR-99	CONTYLL
	TR-124	OSINTXU
	TR-125	OSINTXU
A-48	TR-126	OSINTXU
OSINTXU	TR-127	LATERAL OSINTXU, 2
	TR-128	LATERAL OSINTXU, 26
	CR-95	
	CR-96	

^{*} Tramos no definidos en el Plan de Accesibilidad del 2007


Zona Libre	Nombre
ZL-01	PLAZA TORREKO
ZL-02	PLAZA JUSTO GARATE
ZL-03	PLAZA OXIRONDO
ZL-04	PARQUE USONDO
ZL-05	PLAZA FRAISKOZURI
ZL-06	PLAZA S. ARRIETA
ZL-07	PLAZA OSTETA
ZL-08	PLAZA OSINTXU
ZL-09	BARRIO ANGIOZAR
ZL-10	JARDINES IRIZAR
ZL-11	PARQUE ERROTALDE

3. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL


Se mantiene el análisis realizado en el Plan de Accesibilidad del 2007.

Sobre topografía actual de Bergara se representan las tipologías de las distintas calles con un código de colores. En otro plano sobre la misma topografía actual se representan las calles y zonas peatonales con pendientes superiores al 6%.

3.1 TIPOLOGIEN ARABERAKO SAILKAPENA (Egungo egoera) / CLASIFICACION POR TIPOLOGIAS (Estado actual)

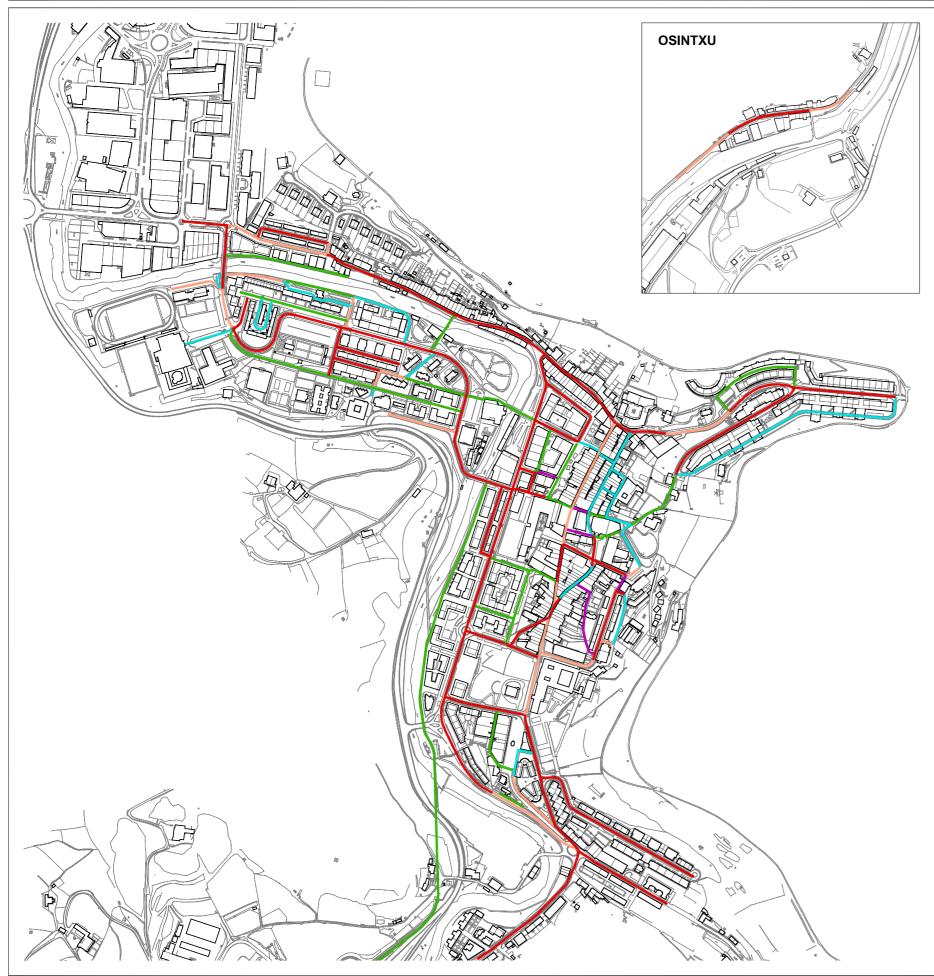


3.2 TIPOLOGIEN ARABERAKO SAILKAPENA (Egungo egoera) / CLASIFICACION POR TIPOLOGIAS (Estado actual)

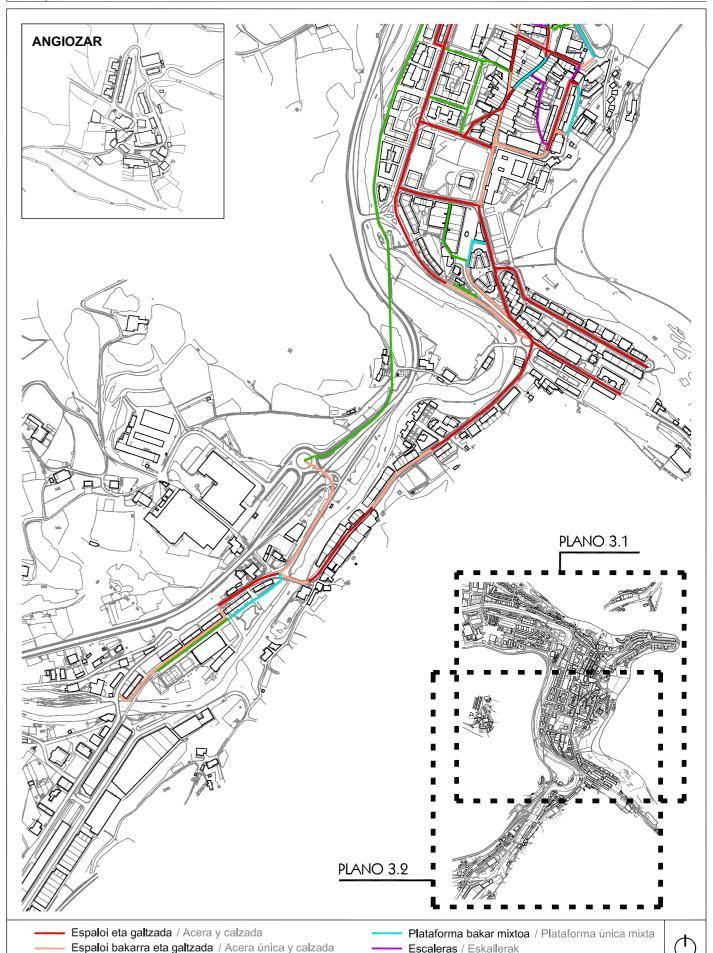


Oinezkoen plataforma bakarra / Plataforma única peatonal

3.3 ALDAPEN AZTERKETA (Egungo egoera) / ESTUDIO de PENDIENTES (Estado actual)

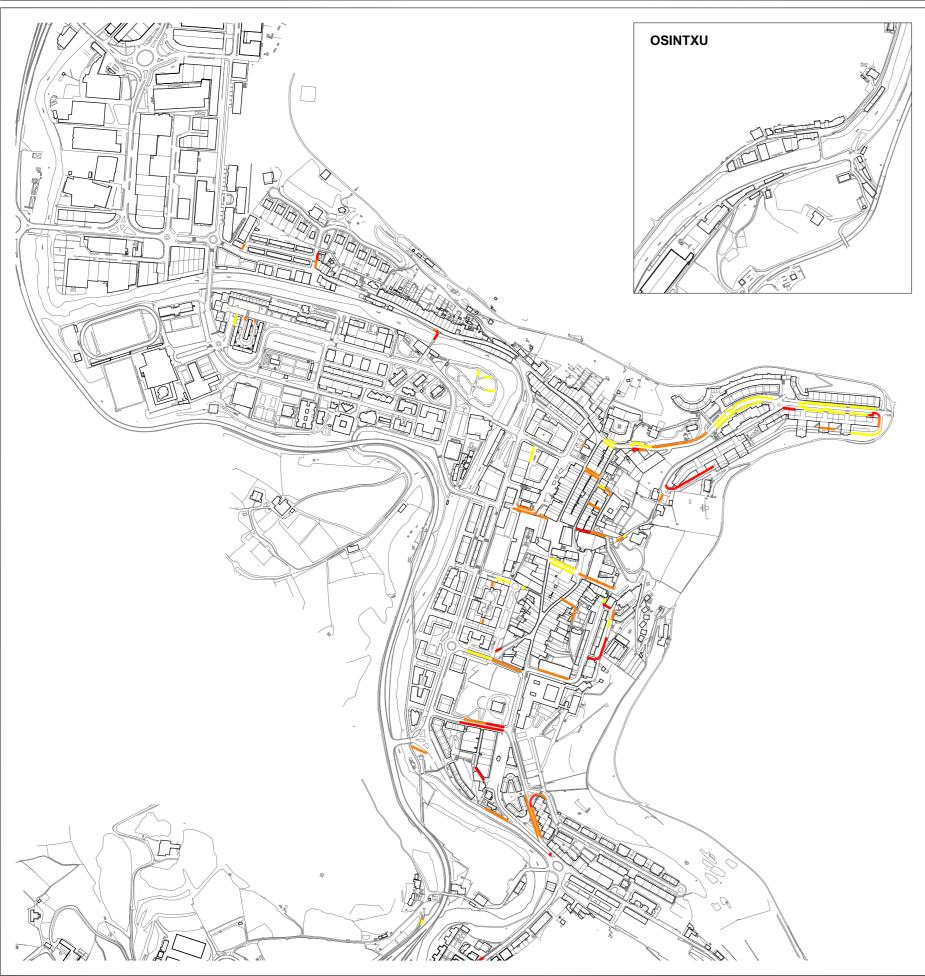

3.4 ALDAPEN AZTERKETA (Egungo egoera) / ESTUDIO de PENDIENTES (Estado actual)

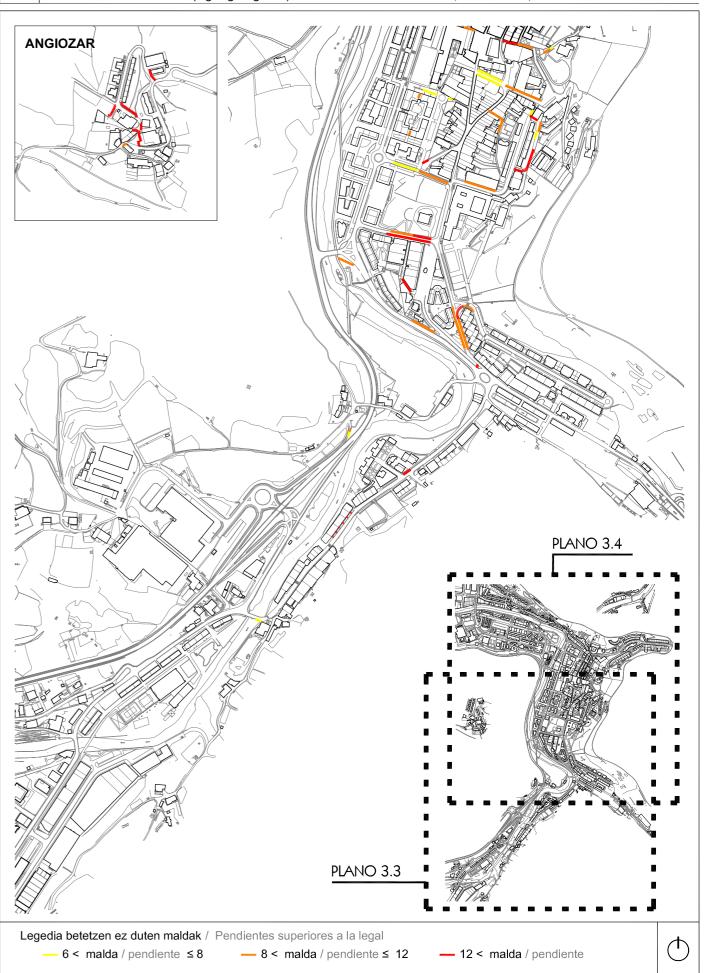

4. TIPOLOGÍAS DE MOBILIARIO URBANO

A continuación se repasan las fichas de diferentes tipos de elementos urbanos o de mobiliario urbano estudiados en el Plan de Accesibilidad del 2007. En dicho Plan diferenciaron las siguientes tipologías:

- Alcorques
- Bancos
- Bocas de riego
- Bolardos
- Fuentes
- Jardineras
- Papeleras

4.1. ALCORQUES

Se mantiene el mismo criterio e inventario de alcorques realizados en el Plan de Accesibilidad del 2007.

4.2. BANCOS

Se mantiene el mismo criterio e inventario de bancos realizados en el Plan de Accesibilidad del 2007.

Destacar el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento de Bergara en la colocación de nuevos bancos con reposabrazos en los últimos años, cumpliendo de esta manera con la ley de mejora de accesibilidad en elementos urbanos.

4.3. BOCAS DE RIEGO

Se mantiene el mismo criterio en el análisis de las bocas de riego del Plan de Accesibilidad del 2007.

4.4. BOLARDOS

Se mantiene el mismo criterio en el análisis de los bolardos realizados del Plan de Accesibilidad del 2007.

4.5. JARDINERAS

Se mantiene el mismo criterio en el análisis de las jardineras del Plan de Accesibilidad del 2007.

4.6. FUENTES

Se mantiene el mismo criterio en el análisis de las fuentes del Plan de Accesibilidad del 2007.

4.7. PAPELERAS

Recientemente se ha instaurado el nuevo sistema de recogida de residuos denominado PAP, por lo que se actualizan las fichas de las papeleras manteniendo el criterio establecido en el Plan de Accesibilidad del 2007.

ELEMENTO A SUSTITUIR

Fotografía Diagnóstico Este tipo de papelera se puede considerar accesible a pesar de no tener todo su perímetro proyectado a planta. Aspectos diagnosticados Medición Cumple Sin voladizos - NO Boca a una altura de 0,90 m. O,90 m SI

PAPELERA PA-08				
Fotografía		Diagnóstico		
	accesible a pe	apelera se pued esar de no tenei ctado a planta.		
Aspectos diagnosticados		Medición	Cumple	
Sin voladizos		-	NO	
Boca a una altura de 0,90 m. 0,9		0,90 m	SI	
Propuesta				
ELEMENTO A SUSTITUIR			NO	

NO

ELEMENTO A SUSTITUIR

PAPELERA PA-07 Fotografía Diagnóstico Este tipo de papelera se puede considerar accesible a pesar de no tener todo su perímetro proyectado a planta. Medición **Aspectos diagnosticados** Sin voladizos Boca a una altura de 0,90 m. 0,90 m **Propuesta**

COLGADOR PA-07			
Fotografía Diagnóstico			
	Este tipo de colgador no puede considerarse accesible puesto que no presentodo su perímetro proyectado a planta, que puede hacer difícilmente detectab por usuarios de bastón guía. También se observa que este colgade tiene algunos enganches a una altura se perior a la fijada. Lo normal es que se asigne los de una altura determinada a lo usuarios de movilidad reducida.		no presenta o a planta, lo te detectable este colgador una altura su- al es que se erminada a los
Aspectos diagnosticados		Medición	Cumple
Sin voladizos		-	NO
Boca a una altura de 0,90 m.		0,60 - 1,80m	SI
Propuesta			
ELEMENTO A SUSTITUIR			NO

Cumple

NO

SI

NO

5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

No se realizan criterios de priorización, ya que no se establecen planes de etapa en el presente Plan.

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Se realizan dos tipos de actuación. Por un lado, están las intervenciones puntuales, y por otro las generales, que tienen carácter de urbanización.

En las segundas actuaciones hay algunas derivadas de actuaciones urbanísticas como las que se generarán en el cruce de San Antonio con el derribo de los edificios 2, 4, 6, 8 y 10 de la calle. En otras actuaciones urbanizadoras, dadas las condiciones especiales de las calles, muy estrechas en algunos casos, se buscan soluciones que aunque no respetan estrictamente las normativas vigentes mejoran la accesibilidad actual. En las actuaciones urbanizadoras del Casco Histórico se proponen actuaciones de plataforma única como las ejecutadas en los últimos años.

70114	CALLE	DDECUBLICATO
ZONA	CALLE	PRESUPUESTO
A-1	IBARRA kalea	16.092,30 €
A-2	IBARRA kalea	17.448,05 €
A-3	OZAETA kalea	29.135,95 €
A-4	OZAETA kalea	33.510,35 €
A-5	ZUBIAURRE kalea	22.693,60 €
A-6	MARTOKO kalea	27.133,65 €
A-7	SAN ANTONIO kalea	271.864,15 €
A-8	MINTEGI kalea	28.758,50 €
A-9	ARTZAMENDI kalea	123.904,75 €
A-10	ESPOLOIA kalea	563.955,20 €
A-11	IBARGARAI kalea	51.668,25 €
A-12	ARRIZURI kalea	18.423,50 €
A-13	ESPOLOIA kalea	2.069,60 €
A-14	IPARRAGIRRE kalea	13.569,85 €
A-15	IBARGARAI kalea	
	FRAISKOZURI, ZURRADERO, HERRILAGUNAK, IBARGARAI	
A-16	kaleak	4.072,10 €
A-17	IPARRAGIRRE, BELANBIDE, IKERLEKU kaleak	1.163,20 €
A-18	ZABALOTEGI kalea	64.973,70 €
A-19	BIDEKURUTZETA, SAN PEDRO, RAMON Mª LILI kaleak	247.336,50 €
A-20	MIZPILDI, KOMENIO kaleak; MADALENA plaza	171.168,85 €
A-21	SAN MARTIN AGIRRE, SAN PEDRO ARIZNOA kaleak	277.652,55 €
4 00	GOENKALE, LAUDANTZ, ERROMAGALARTZA, J.IRAZABAL,	0.004.40.6
A-22	K.ELEIZALDE kaleak	6.824,10 €
A-23	ARTEKALE, ARRURIAGA kaleak	454 770 00 6
A-24	BARRENKALE kalea; ARRESE kantoia DOMINGO IRALA, HERRILAGUNAK, TELESFORO ARANZADI	151.776,00 €
A-25	kaleak; IRIZAR pasealekua	16.740,95 €
A-26	BIDEBERRI, IRIZAR, KRUZ GALLASTEGI, JUAN XXIII kaleak	17.048,80 €
A-27	BOLU, ARANERREKA, K. ELEIZALDE, kaleak	166.311,00 €
A-28	BURDIÑATE, MASTERREKA kaleak	30.222,70 €
A-29	MASTERREKA kalea	243.712,00 €
A-30	ZUBIETA kalea	442.623,20 €
A-31	MUGERTZA kalea	7.311,15 €
A-32	MOIUA, MADURA kaleak	15.055,30 €
A-33	LEIZARIAKO SAN LORENTZO kalea	9.540,50 €
A-34	AMILLAGA, BONI LASKURAIN kaleak; SANTALAITZ zubia	10.083,50 €
A-35	Desde el puente de SANTALAITZ al aparcamiento MUGERTZA	344,00 €
A-36	BONI LASKURAIN, MATXIATEGI kaleak, HILERRIA	13.439,25 €
A-37 / A-38	BONI LASKURAIN kalea	<u>-</u>
A-36 A-39	IBAIONDO kalea	
A-39 A-40	ALKABIETA, A. FLEMING, HILERRIA, BONI LASKURAIN kaleak	31.736,75 €
	ALIA DIE IA, A. I LEIMINO, HILLINIA, DONI LAONONAIN KAIEAK	51.150,15 C

A-41	BONI LASKURAIN kalea	671,25 €
A-42	MATXIATEGI, E.URDANGARIN kaleak	7.580,65 €
A-43	SANTA MARINA zubia	1.118,70 €
A-44	E.URDANGARIN kalea, MATADERO zubia	10.386,45 €
A-45	SAN MARTZIAL kalea	1.118,70 €
A-46	ORTUIZA kalea	
A-47	ANTIGUA FFCC	13.200,55 €
A-48	OSINTXU	33.654,35 €

PRESUPUESTO TOTAL DE CALLES: 3.217.094,68 €

	ZONA LIBRE	PRESUPUESTO
ZL-01	PLAZA TORREKO	23.152,14 €
ZL-02	PLAZA JUSTO GARATE	12.253,04 €
ZL-03	PLAZA OXIRONDO	2.863,26 €
ZL-04	PARQUE USONDO	2.236,88 €
ZL-05	PLAZA FRAISKOZURI	17.120,11 €
ZL-06	PLAZA S. ARRIETA	11.637,70 €
ZL-07	PLAZA OSTETA	
ZL-08	PLAZA OSINTXU	2.919,19 €
ZL-09	BARRIO ANGIOZAR	27.950,16 €
ZL-10	JARDINES IRIZAR	2.371,09 €
ZL-11	PARQUE ERROTALDE	

PRESUPUESTO TOTAL ZONAS LIBRES:

102.503,35 €

En el plano (ver planos plegados Din A0 que se anexan) podemos ver una representación gráfica de las intervenciones más importantes entre las que no encontramos las siguientes:

Plano de Intervenciones sobre elementos de urbanización:

- Por un lado, se representa la zona incluida en la propuesta donde se propone la conversión en plataforma única.
- También se incluye la propuesta de ampliación de aceras, es decir aquellas calles incluidas en la propuesta donde se propone ampliar la acera para hacerla accesible. Se representan los tramos de acera que se propone ensanchar.
- En el mismo plano se presenta el estudio de los vados peatonales, en el que se representa la ubicación de los vados peatonales (rebajes de acera para el paso de los peatones) clasificados según la intervención que es necesario realizar sobre ellos para que sean accesibles:

- * Construcción de vado: Se propone en aquellos puntos donde, existiendo un paso de cebra, la acera no se encuentra rebajada.
- * Reconstrucción de vado: Se propone en aquellos pasos peatonales donde existe vado o rebaje, pero ejecutado de tal manera que no resulta operativo (por ejemplo por que la altura del bordillo no está completamente rebajada hasta cota de calzada).
- * Adaptación de vados: El paso peatonal cuenta con vado o rebaje de acera ejecutado de modo que resulta operativo, pero al que le faltan algunos detalles para resultar accesible (por ejemplo el pavimento de alarma o la franja señalizadora hasta la fachada).
- * Vados sin intervención: El vado o rebaje de la acera se ajusta a los parámetros establecidos en la ley de accesibilidad, y es por tanto accesible.
- * Construcción de vado y paso peatonal: Se propone en aquellos cruces donde se considera necesaria la implantación de un paso de cebra, y los correspondientes rebajes de las aceras.
- En este mismo plano se representan otras intervenciones fundamentales por su repercusión en el nivel de accesibilidad de la vía pública, como son la adaptación de las escaleras, la supresión de escalones aislados, instalación de barandillas, y la sustitución de alcorques y rejas.

Plano de Desplazamiento de mobiliario urbano:

• Se presenta otro plano en el que se indican intervenciones relativas al desplazamiento de elementos de mobiliario urbano, como farolas, bancos o papeleras.

7. PLAN DE ETAPAS

En el presente Plan no se establece un Plan de Etapas.

8. PRESUPUESTO ESTIMATIVO

La propuesta económica que se expone a continuación recoge todos lo conceptos que pudieran en algún momento incidir sobre el Plan de Accesibilidad, y en concreto sobre el presupuesto de actuación en la vía pública.

El presupuesto final se calcula aplicando una serie de conceptos al presupuesto total de las intervenciones materiales, que llamaremos Presupuesto de Ejecución Material. El presupuesto final consta, pues, de los siguientes apartados:

- 1. Por un lado, el **Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)** que recoge el coste real de la puesta en obra de las intervenciones previstas en cada fase, es decir, el presupuesto de las intervenciones a realizar en cada una de las calles y plazas.
- 2. Un segundo concepto es la Base Imponible (B.I.) que recoge otros conceptos que conviene tener en cuenta a la hora de realizar los proyectos de ejecución de obra. La Base Imponible (B.I.) se calcula sobre la base del Presupuesto de Ejecución Material e incluye conceptos como los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y la Redacción y Dirección de Proyectos Ejecutivos.
- 3. El tercer apartado es el referido a los impuestos, donde se incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable, que se calcula sobre la base de la suma de los apartados anteriores (P.E.M. y B.I.). La suma de estos tres apartados nos da el presupuesto final correspondiente a los edificios municipales.
- 4. Este apartado incluye otros conceptos que son de interés para llevar adelante el Plan de Accesibilidad, y que quedan a criterio del propio Ayuntamiento incluirlos en el presupuesto final del Plan Cuadrienal de Accesibilidad.

En el presupuesto general se incluye una partida para actuaciones sobre calles y espacios peatonales no incluidos en el Plan que pudieran incluirse a petición específica de particulares, entidades, etc. (5% de la Base Imponible).

VÍA PÚBLICA - PRESUPUESTO PLAN DE ACCESIBILIDAD

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)

Presupuesto de Zonas Libres 102.503,35 €
Presupuesto de Calles 3.217.094,68 €

Total Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	3.319.598,03 €
---	----------------

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%)	232.371,86 €
Beneficio industrial (6%)	199.175,88 €
Gastos generales (13%)	431.547,74 €

Total de la Base Imponible (B.I.) 4.182.693,52 €

Impuestos

Impuesto de Valor Añadido - IVA (21%) 878.365,64 € **Total de Impuestos** 878.365,64 €

Total de Presupuesto General de Vía Pública 5.061.059,16 €

Otros conceptos de interés para el Plan de Accesibilidad

Actuación a petición de los ciudadanos (5% B.I.) 209.134,68 €

ANEXO I:

Informes de Zonas Libres

Los siguientes informes se desarrollan mediante el análisis de los **elementos de urbanización** y el **mobiliario urbano** definidos como deficitarios por el Plan 2007, por incumplimiento de normativa o por interferir en el adecuado uso de la vía pública. Además de observar y analizar estas deficiencias definidas por dicho plan, se definen nuevas propuestas de mejora de urbanización acordes a las necesidades actuales y futuras del municipio.

Los informes de las Calles y Zonas Libres se estructuran de la siguiente manera:

- 1. Información y situación de la zona con fotografías ilustrativas.
- 2. Documentación gráfica que incluye:
 - 2.1. Plan de Accesibilidad del 2007: se recoge la misma documentación presentada en el mencionado Plan.
 - 2.2. Estado Actual en referencia al Plan de Accesibilidad del 2007: se analizan si se han solucionado o no los problemas detectados en dicho Plan.
 - 2.3. Propuesta de intervención: además de proponer nuevas propuestas de intervención, se recogen las actuaciones no solucionadas actualmente.
 - 2.4. Presupuesto: se realiza un presupuesto estimativo de la intervención propuesta.

Para la elaboración del presupuesto, se ha tomado como referencia la partida de presupuestos del Plan de Accesibilidad del 2007, actualizándolo con una subida del 10%.

Aurkibidea / Indice

MUGATUTAKO GUNE LIBREAK / DELIMITACION DE ZONAS LIBRES:

ZL-01 / ZL-02 / ZL-03 / ZL-04 / ZL-05 / ZL-06 / ZL-07 / ZL-08 / ZL-09 / ZL-10 / ZL-11



RELACIÓN DE ZONAS LIBRES

ZL-01	PLAZA TORREKO
ZL-02	PLAZA JUSTO GARATE
ZL-03	PLAZA OXIRONDO
ZL-04	PARQUE USONDO
ZL-05	PLAZA FRAISKOZURI
ZL-06	PLAZA S. ARRIETA
ZL-07	PLAZA OSTETA
ZL-08	PLAZA OSINTXU
ZL-09	BARRIO ANGIOZAR
ZL-10	JARDINES IRIZAR
7I -11	PAROLIE ERROTAL DE

Informazioa Información

ZL-01

plaza - TORREKO - plaza

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación



Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta

En esta plaza existen varios accesos con escaleras, han de ser adaptados por medio de pasamanos, franjas señalizadoras y bandas rugosas.


Respecto al Plan de Accesibilidad del 2007, únicamente se ha eliminado la fuente existente en la plaza, por lo que se mantienen todas las intervenciones propuestas en el mencionado Plan, exceptuando la sustitución de rejas o registros, que se han suprimido por tratarse de modelos normalizados.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds. mts. mts2)

Escalera	4
Escalón aislado	1
Rejilla lineal	2

Atalka banatutako presupuestoaren laburpena / Resumen del Presupuesto por Conceptos

Comunicación	8.254,73 €
Intervención sobre escaleras	671,08€
Pasamanos	13.868,45 €
Sustitución de mobiliario urbano	357,90 €
PRESUPUESTO TOTAL	23.152,14€

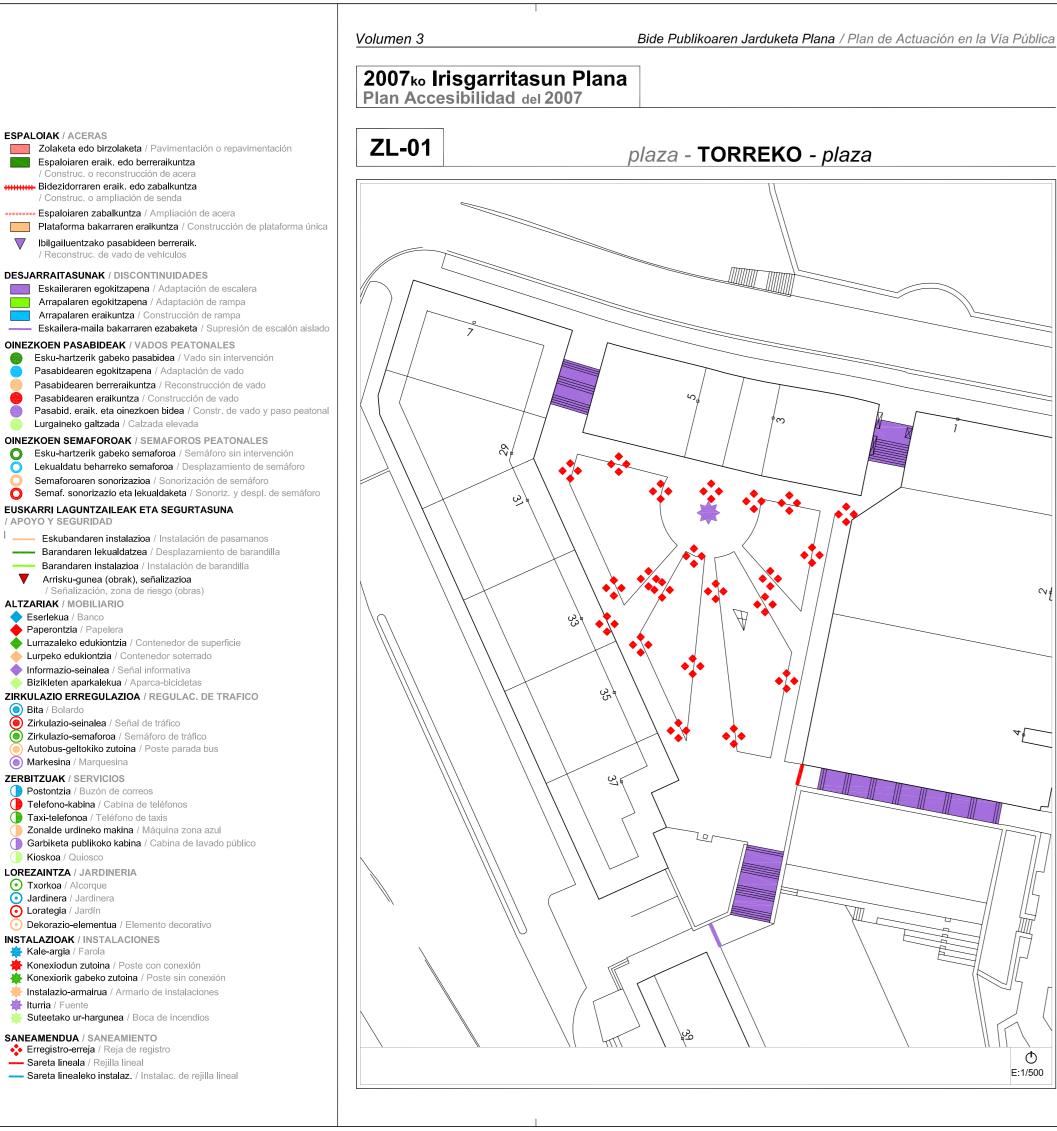

ESPALOIAK / ACERAS

Espaloiaren eraik. edo berreraikuntza HIHHHH- Bidezidorraren eraik. edo zabalkuntza / Construc, o ampliación de senda Espaloiaren zabalkuntza / Ampliación de acera

Ibilgailuentzako pasabideen berreraik. Reconstruc. de vado de vehículos DESJARRAITASUNAK / DISCONTINUIDADES

Arrapalaren egokitzapena / Adaptación de rampa Arrapalaren eraikuntza / Construcción de rampa

Pasabidearen egokitzapena / Adaptación de vado

Pasabidearen eraikuntza / Construcción de vado

OINEZKOEN PASABIDEAK / VADOS PEATONALES

Lurgaineko galtzada / Calzada elevada

EUSKARRI LAGUNTZAILEAK ETA SEGURTASUNA

Arrisku-gunea (obrak), señalizazioa

Zirkulazio-seinalea / Señal de tráfico Zirkulazio-semaforoa / Semáforo de tráfico Autobus-geltokiko zutoina / Poste parada bus

Markesina / Marquesina ZERBITZUAK / SERVICIOS Postontzia / Buzón de correos Telefono-kabina / Cabina de teléfonos Taxi-telefonoa / Teléfono de taxis

Kioskoa / Quiosco LOREZAINTZA / JARDINERIA Txorkoa / Alcorque Jardinera / Jardinera Lorategia / Jardín

Iturria / Fuente

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES 🜞 Kale-argia / Farola

SANEAMENDUA / SANEAMIENTO Erregistro-erreja / Reja de registro

- Sareta lineala / Rejilla lineal

Barandaren instalazioa / Instalación de barandilla

Lurrazaleko edukiontzia / Contenedor de superficie Lurpeko edukiontzia / Contenedor soterrado Informazio-seinalea / Señal informativa Bizikleten aparkalekua / Aparca-bicicletas

Zonalde urdineko makina / Máquina zona azul Garbiketa publikoko kabina / Cabina de lavado público

Dekorazio-elementua / Elemento decorativo

Konexiodun zutoina / Poste con conexión Konexiorik gabeko zutoina / Poste sin conexión instalazio-armairua / Armario de instalaciones


Suteetako ur-hargunea / Boca de incendios

Sareta linealeko instalaz. / Instalac. de rejilla lineal

/ APOYO Y SEGURIDAD

ALTZARIAK / MOBILIARIO Eserlekua / Banco Paperontzia / Papelera

Bita / Bolardo

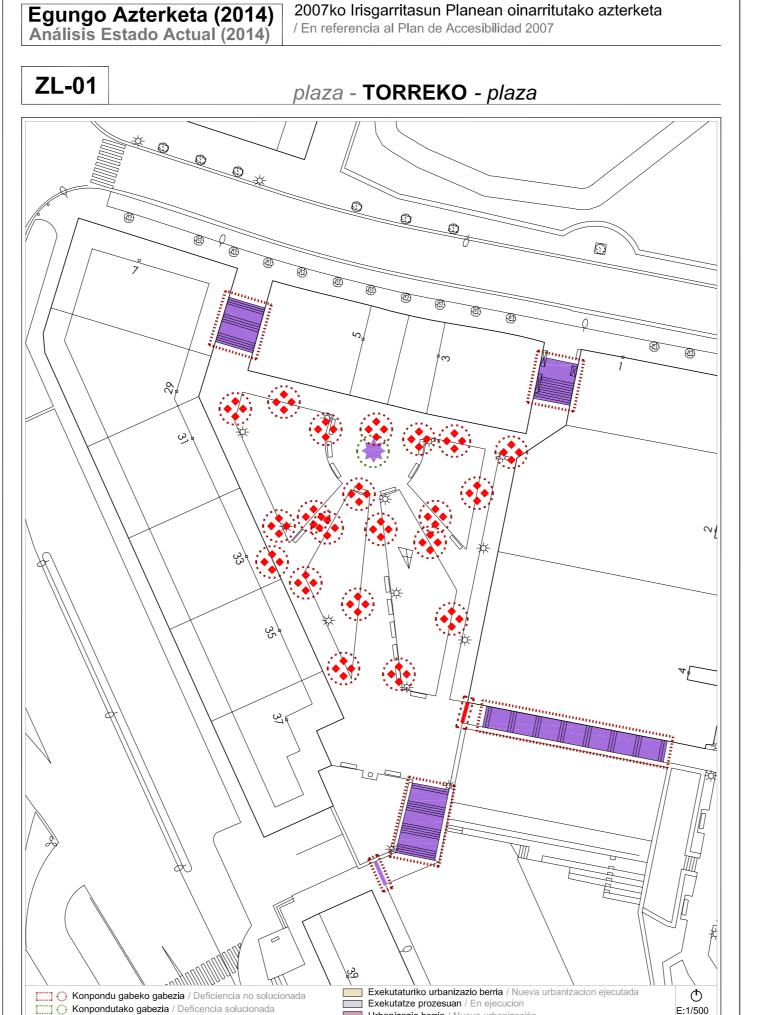

Urbanizazio berria / Nueva urbanización

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

E:1/500

Volumen 3

Volumen 3 Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública Proposamena (2014) Propuesta (2014) Dokumentazio grafikoa / Documentación gráfica

ZL-01 plaza - TORREKO - plaza



Volumen 3

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

ZL-01

plaza - TORREKO - plaza

Plano	Intervención	Uds	Sub
1	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	64	7.157,
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	16	894,
2	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	14	1.565,
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	12	872
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	9	503
3	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	28	3.131
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	30	2.181,
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	6	335
4	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	18	2.013
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	40	2.908
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	10	559,
5	Supresión de escalón aislado.	1	671
6	Sustitución de rejilla lineal.	2	357
	Presupuesto de	Ejecución Material	23.152,

Informazioa Información

ZL-02

plaza - JUSTO GARATE - plaza

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación



Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta

De los cuatro accesos de que dispone esta plaza, el situado por la C/ Ibargarai ha de ser adaptada la escalera con bandas rugosas y franjas señalizadoras. Del mismo modo que el acceso por la C/ Ikerleku, en el que se aconseja instalarle pasamanos adaptados, puesto que su pendiente es superior al 6%. Por lo que respecta a su recorrido interior, la principal intervención se basa en colocar también bandas rugosas, franjas señalizadoras y pasamanos adaptados, puesto existen una rampa y tramos de escaleras que no cumplen con la Ley de Accesibilidad.


No se ha ejecutado ninguna intervención propuesta en el Plan de Accesibilidad del 2007, por lo que se mantienen todas las intervenciones propuestas.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds, mts, mts2)

Escalera	4
Pendiente > 6%	13
Rampa	1

Atalka banatutako presupuestoaren laburpena / Resumen del Presupuesto por Conceptos

Comunicación	7.173,81 €
Pasamanos	3.965,32€
PRESUPUESTO TOTAL	12.253,04 €

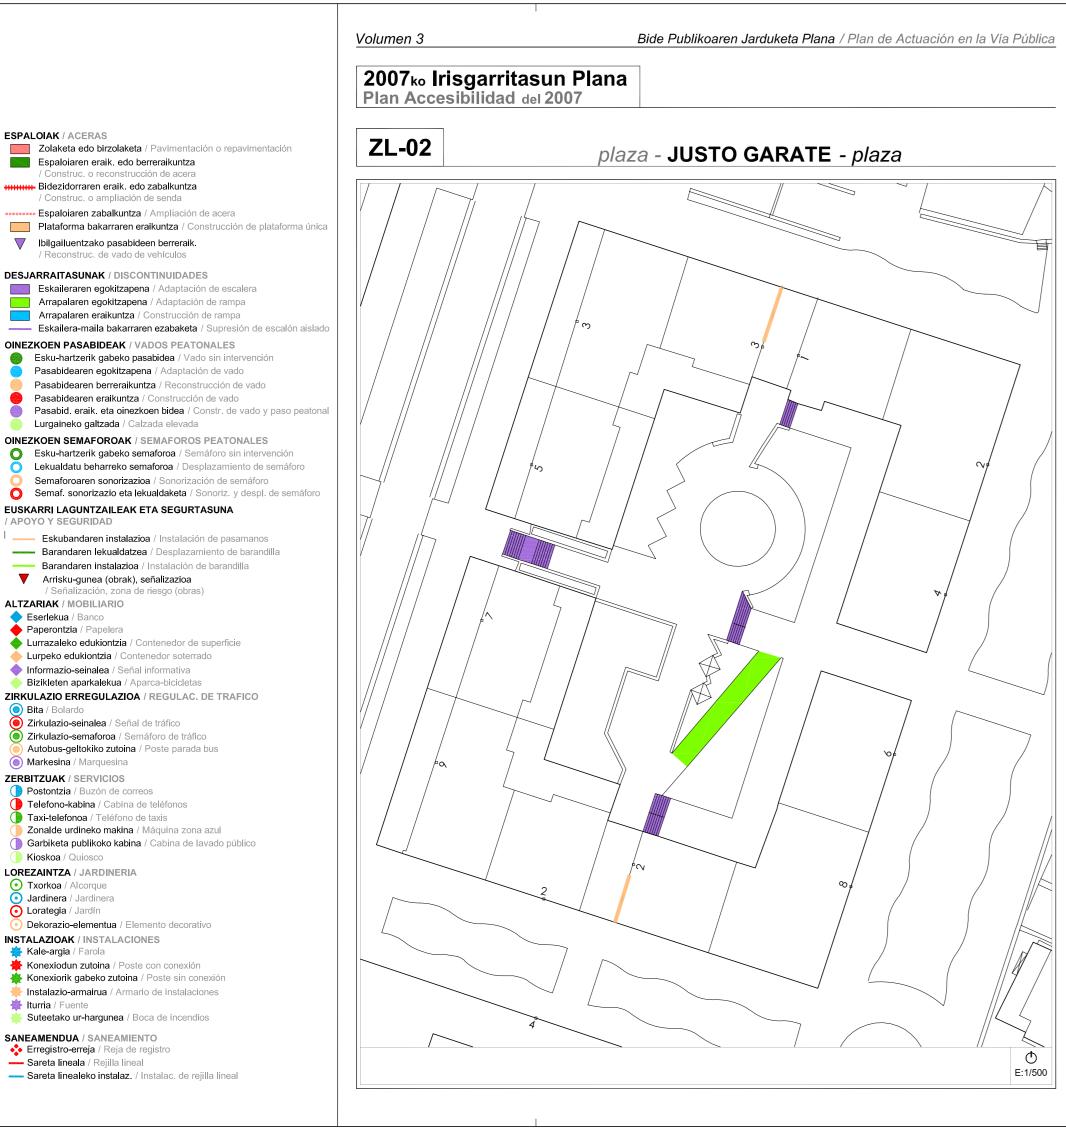

ESPALOIAK / ACERAS

Espaloiaren eraik. edo berreraikuntza HIHHHH- Bidezidorraren eraik. edo zabalkuntza / Construc, o ampliación de senda

Ibilgailuentzako pasabideen berreraik. Reconstruc. de vado de vehículos **DESJARRAITASUNAK / DISCONTINUIDADES**

Lurgaineko galtzada / Calzada elevada

Arrisku-gunea (obrak), señalizazioa

Lurpeko edukiontzia / Contenedor soterrado Informazio-seinalea / Señal informativa Bizikleten aparkalekua / Aparca-bicicletas

Dekorazio-elementua / Elemento decorativo

Konexiodun zutoina / Poste con conexión

Suteetako ur-hargunea / Boca de incendios

instalazio-armairua / Armario de instalaciones

Zirkulazio-seinalea / Señal de tráfico Zirkulazio-semaforoa / Semáforo de tráfico Autobus-geltokiko zutoina / Poste parada bus

/ APOYO Y SEGURIDAD

ALTZARIAK / MOBILIARIO Eserlekua / Banco Paperontzia / Papelera

Bita / Bolardo

Markesina / Marquesina ZERBITZUAK / SERVICIOS Postontzia / Buzón de correos Telefono-kabina / Cabina de teléfonos Taxi-telefonoa / Teléfono de taxis

Kioskoa / Quiosco LOREZAINTZA / JARDINERIA Txorkoa / Alcorque Jardinera / Jardinera Lorategia / Jardín

🕌 Iturria / Fuente


INSTALAZIOAK / INSTALACIONES 🜞 Kale-argia / Farola

SANEAMENDUA / SANEAMIENTO

- Sareta lineala / Rejilla lineal

Erregistro-erreja / Reja de registro



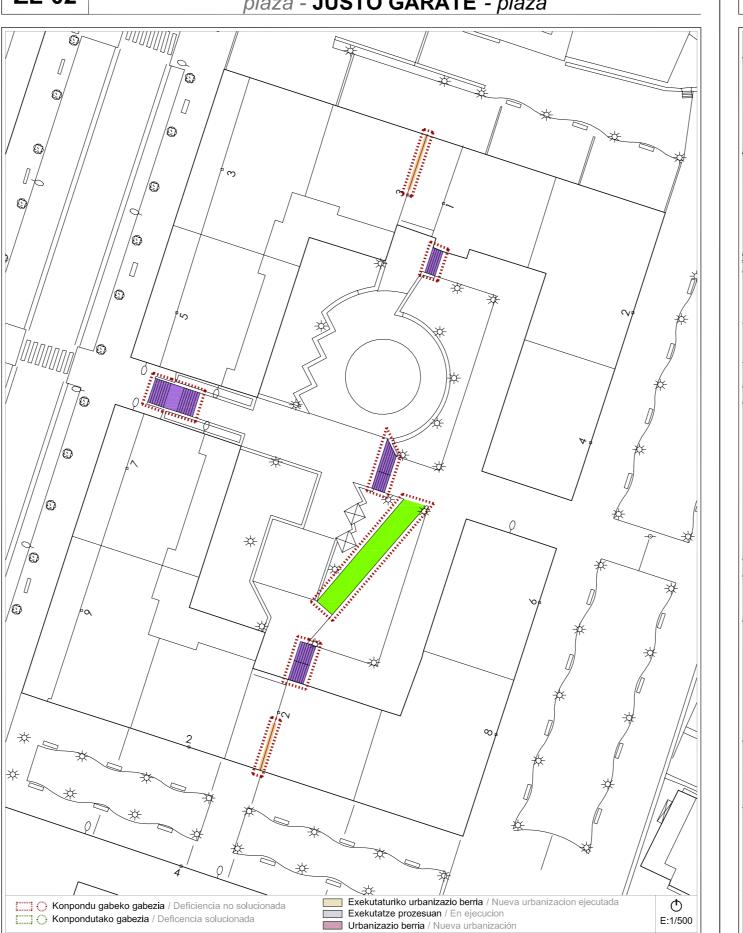



Proposamena (2014) Propuesta (2014) Dokumentazio grafikoa / Documentación gráfica

ZL-02 plaza - JUSTO GARATE - plaza



Volumen 3

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

ZL-02

plaza - JUSTO GARATE - plaza


Plano	Intervención	Uds	Subtota
1	Suministro y colocación de pasamanos.	7	782,89€
2	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	2	223,69 €
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	10	727,07€
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	7	391,45 €
3	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	25	1.817,67 €
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	6	335,52€
4	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	4	447,37 €
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	21	1.526,84 €
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	12	671,06 €
5	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	18	2.013,17 €
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	5	279,61 €
6	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	2	223,69 €
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	21	1.526,84 €
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	11	615,13€
7	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	6	671,06 €
	Presupuesto de	Ejecución Material	12.253,04 €

Informazioa Información

ZL-03

plaza - OXIRONDO - plaza

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación

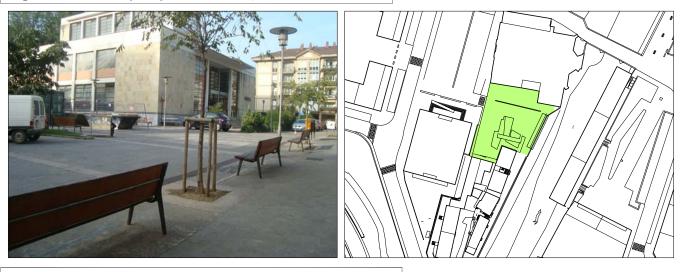

Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta

El grado de accesibilidad en cuanto a los dos accesos de esta plaza están en concordancia con la Ley de Accesibilidad, por lo que no se propone intervención alguna.

Sin embargo, dentro de su recorrido interior se ha detectado la necesidad de varias actuacionesen lo que a su mobiliario urbano se refiere, sobre todo bancos, alcorques y la reja de la fuente, ya que su diseño es inadecuado.


No se ha ejecutado ninguna intervención propuesta en el Plan de Accesibilidad del 2007, por lo que se mantienen todas las intervenciones propuestas, exceptuando la sustitución de rejas o registros que se han suprimido por tratarse de modelos normalizados.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds, mts, mts2)

Alcorque	3
Banco	2

Atalka banatutako presupuestoaren laburpena / Resumen del Presupuesto por Conceptos

Sustitución mobiliario urbano	2.863,26 €
PRESUPUESTO TOTAL	2.863,26 €

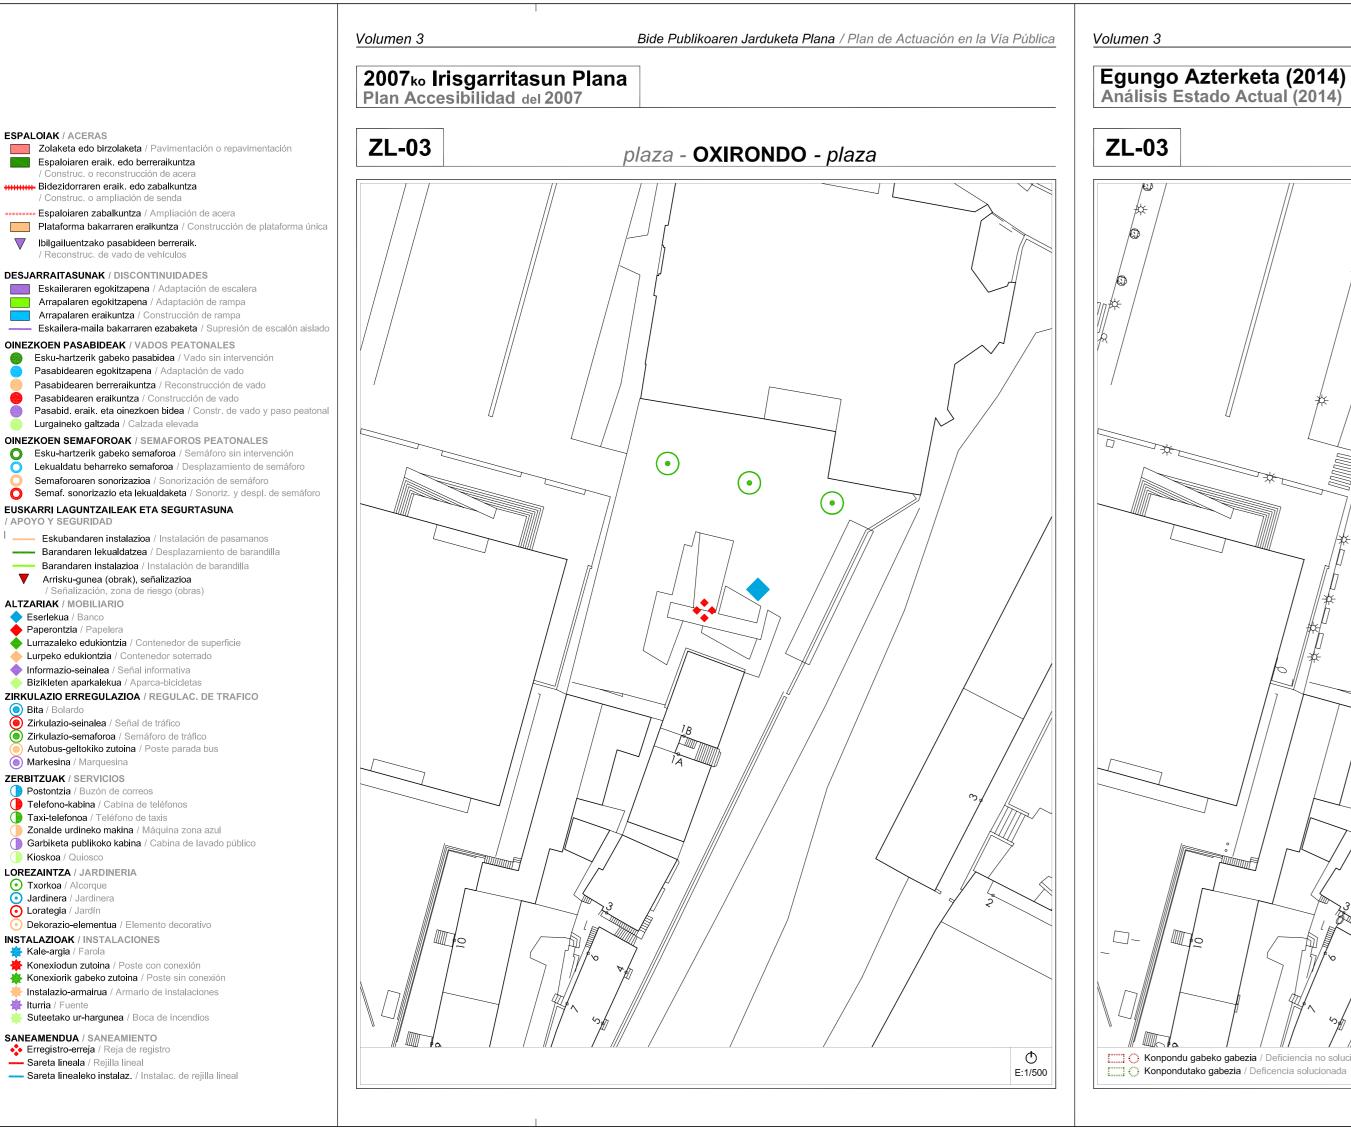

ESPALOIAK / ACERAS

Espaloiaren eraik. edo berreraikuntza HIHHHH- Bidezidorraren eraik. edo zabalkuntza / Construc, o ampliación de senda

Ibilgailuentzako pasabideen berreraik. Reconstruc. de vado de vehículos DESJARRAITASUNAK / DISCONTINUIDADES

Lurgaineko galtzada / Calzada elevada

Arrisku-gunea (obrak), señalizazioa

Lurpeko edukiontzia / Contenedor soterrado Informazio-seinalea / Señal informativa Bizikleten aparkalekua / Aparca-bicicletas

Dekorazio-elementua / Elemento decorativo

Konexiodun zutoina / Poste con conexión

Suteetako ur-hargunea / Boca de incendios

instalazio-armairua / Armario de instalaciones

Zirkulazio-seinalea / Señal de tráfico Zirkulazio-semaforoa / Semáforo de tráfico Autobus-geltokiko zutoina / Poste parada bus

Markesina / Marquesina ZERBITZUAK / SERVICIOS Postontzia / Buzón de correos Telefono-kabina / Cabina de teléfonos Taxi-telefonoa / Teléfono de taxis

Kioskoa / Quiosco LOREZAINTZA / JARDINERIA Txorkoa / Alcorque Jardinera / Jardinera Lorategia / Jardín

🕌 Iturria / Fuente

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES 🜞 Kale-argia / Farola


SANEAMENDUA / SANEAMIENTO Erregistro-erreja / Reja de registro

- Sareta lineala / Rejilla lineal

/ APOYO Y SEGURIDAD

ALTZARIAK / MOBILIARIO Eserlekua / Banco Paperontzia / Papelera

Bita / Bolardo

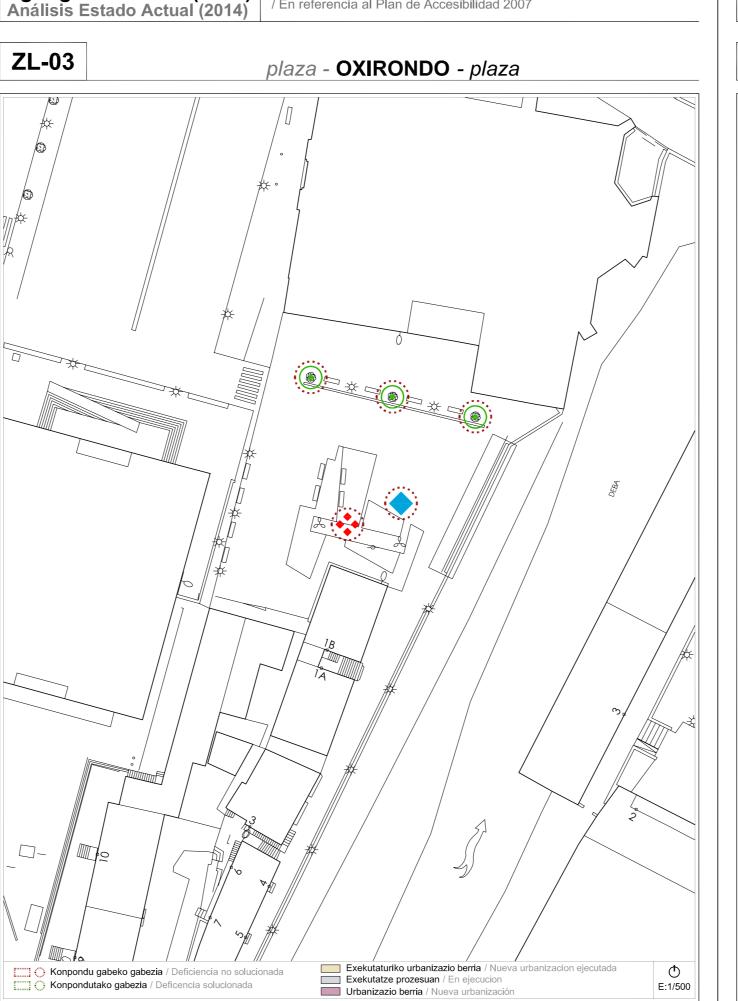

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

2007ko Irisgarritasun Planean oinarritutako azterketa

/ En referencia al Plan de Accesibilidad 2007

Volumen 3

Exekutaturiko urbanizazio berria / Nu

Exekutatze prozesuan / En ejecucion

Urbanizazio berria / Nueva urbanización

Proposamena (2014) Propuesta (2014) Dokumentazio grafikoa / Documentación gráfica **ZL-03** plaza - OXIRONDO - plaza

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública Volumen 3

E:1/500

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

ZL-03

plaza - OXIRONDO - plaza

Plano	Intervención	Uds	Subtotal
1	Instalación de alcorque con reja de fundición con huecos de 1x1 cms, enrasado, indeformable y fijado a la acera.	3	1.744,80 €
2	Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.	2	1.118,46 €
	Presupuesto de Ejecución	Material	2.863,26 €

Informazioa Información

ZL-04

parque - USONDO - parkea

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación



Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta


El único acceso que tiene por Puente Santa María está en perfectas condiciones según las normas técnicas de accesibilidad, sin embargo en su interior se recomienda adaptar la fuente, ya que su diseño no es el adecuado.

Respecto al Plan de Accesibilidad del 2007, únicamente se ha ejecutado la instalación de bancos adaptados. Por otra parte, se ha eliminado la instalación de pasamanos que menciona dicho Plan, ya que se trata de un parque.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds, mts, mts2)

Atalka banatutako presupuestoaren laburpena / Resumen del Presupuesto por Conceptos

Sustitución mobiliario urbano	2.236,88 €
PRESUPUESTO TOTAL	2.236,88 €

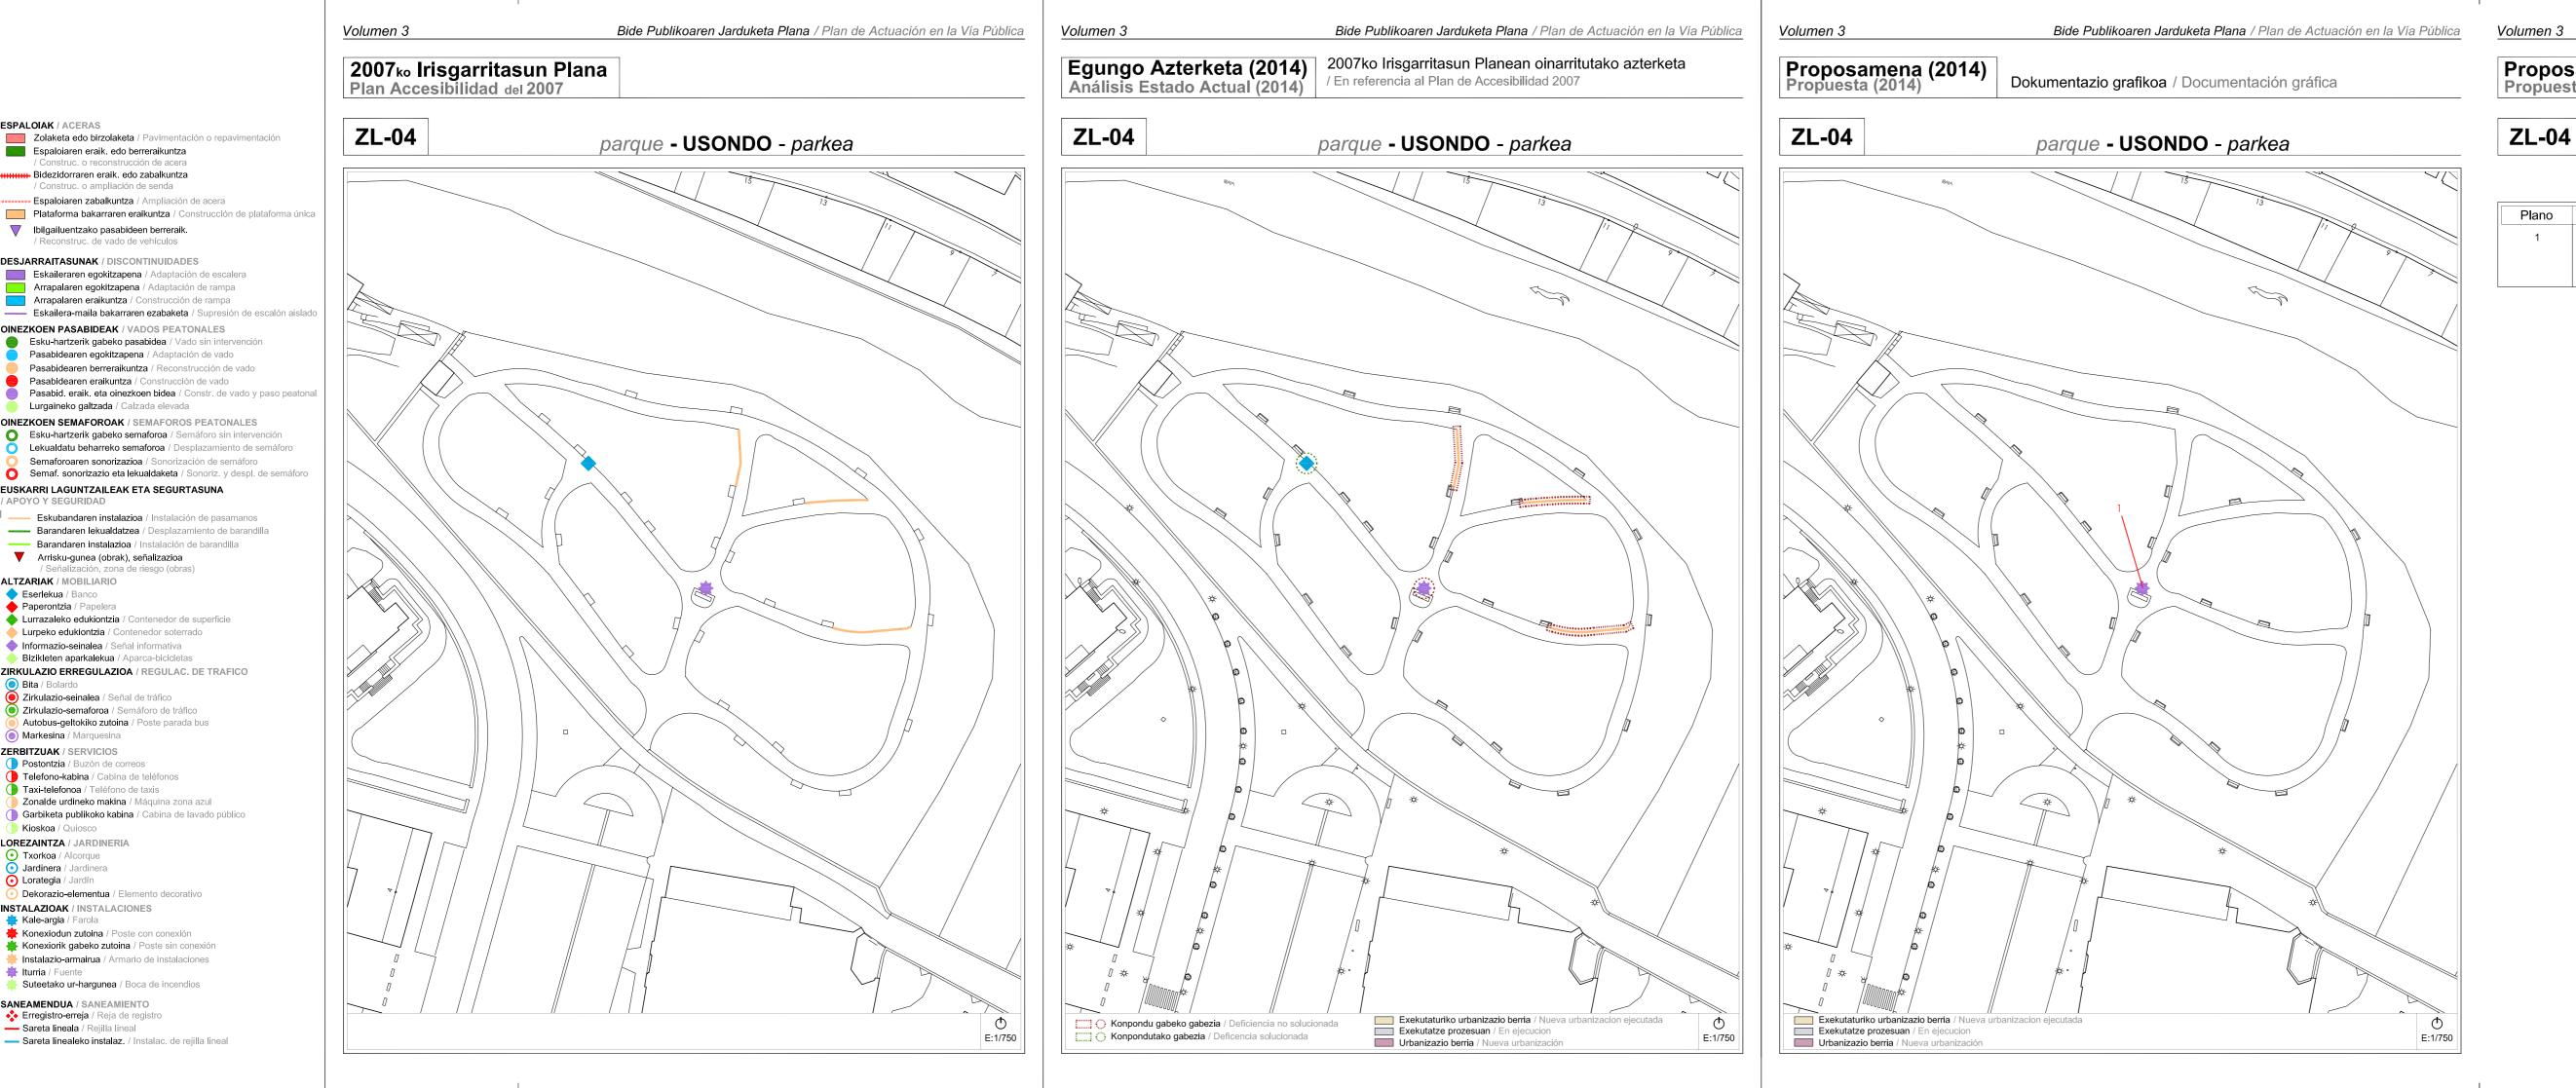

Zolaketa edo birzolaketa / Pavimentación o repavimentación

Espaloiaren eraik. edo berreraikuntza HIHHHH- Bidezidorraren eraik. edo zabalkuntza / Construc, o ampliación de senda Espaloiaren zabalkuntza / Ampliación de acera

Ibilgailuentzako pasabideen berreraik. Reconstruc. de vado de vehículos DESJARRAITASUNAK / DISCONTINUIDADES

Eskaileraren egokitzapena / Adaptación de escalera Arrapalaren egokitzapena / Adaptación de rampa Arrapalaren eraikuntza / Construcción de rampa

OINEZKOEN PASABIDEAK / VADOS PEATONALES Esku-hartzerik gabeko pasabidea / Vado sin intervención Pasabidearen egokitzapena / Adaptación de vado Pasabidearen berreraikuntza / Reconstrucción de vado Pasabidearen eraikuntza / Construcción de vado

Lurgaineko galtzada / Calzada elevada

EUSKARRI LAGUNTZAILEAK ETA SEGURTASUNA

Arrisku-gunea (obrak), señalizazioa

Zirkulazio-seinalea / Señal de tráfico Zirkulazio-semaforoa / Semáforo de tráfico Autobus-geltokiko zutoina / Poste parada bus

/ APOYO Y SEGURIDAD

ALTZARIAK / MOBILIARIO Eserlekua / Banco Paperontzia / Papelera

Bita / Bolardo

Markesina / Marquesina ZERBITZUAK / SERVICIOS Postontzia / Buzón de correos Telefono-kabina / Cabina de teléfonos Taxi-telefonoa / Teléfono de taxis

Kioskoa / Quiosco LOREZAINTZA / JARDINERIA Txorkoa / Alcorque Jardinera / Jardinera Lorategia / Jardín

🕌 Iturria / Fuente

OINEZKOEN SEMAFOROAK / SEMAFOROS PEATONALES Esku-hartzerik gabeko semaforoa / Semáforo sin intervención

Eskubandaren instalazioa / Instalación de pasamanos Barandaren lekualdatzea / Desplazamiento de barandilla Barandaren instalazioa / Instalación de barandilla

Lurrazaleko edukiontzia / Contenedor de superficie Lurpeko edukiontzia / Contenedor soterrado Informazio-seinalea / Señal informativa Bizikleten aparkalekua / Aparca-bicicletas

ZIRKULAZIO ERREGULAZIOA / REGULAC. DE TRAFICO

Zonalde urdineko makina / Máquina zona azul Garbiketa publikoko kabina / Cabina de lavado público

Dekorazio-elementua / Elemento decorativo

Konexiodun zutoina / Poste con conexión Konexiorik gabeko zutoina / Poste sin conexión instalazio-armairua / Armario de instalaciones

Suteetako ur-hargunea / Boca de incendios

Sareta linealeko instalaz. / Instalac. de rejilla lineal

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES 🜞 Kale-argia / Farola

SANEAMENDUA / SANEAMIENTO Erregistro-erreja / Reja de registro

- Sareta lineala / Rejilla lineal

Semaforoaren sonorizazioa / Sonorización de semáforo

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

parque - USONDO - parkea

no	Intervención	Uds	Subtotal
	Suministro y colocación de fuente adaptada.	1	2.236,88 €
	Presupuesto de Ejecución	Material	2.236,88 €

ZL-05

plaza - FRAISKOZURI - plaza

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación



Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta


En esta plaza las intervenciones recomendables son la adaptación de los tramos de escaleras y rampas encontrados. Para ello, próximamente se va a construir una nueva rampa a la altura del bloque de viviendas nº 3, que cumplirá con la normativa de accesibilidad, y se suprimirán las rampas existentes en frente de los bloques nº 3 y 4 por las escaleras contiguas.

En cuanto a su recorrido interior, se ha detectado la necesidad de sustituir parte de su mobiliario urbano por su incorrecto diseño como la fuente.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds, mts, mts2)

Escalera	3
Fuente	1
Rampa	2

Comunicación	11.080,58€
Pasamanos	3.802,65€
Sustitución mobiliario urbano	2.236,88 €
PRESUPUESTO TOTAL	17.120,11 €

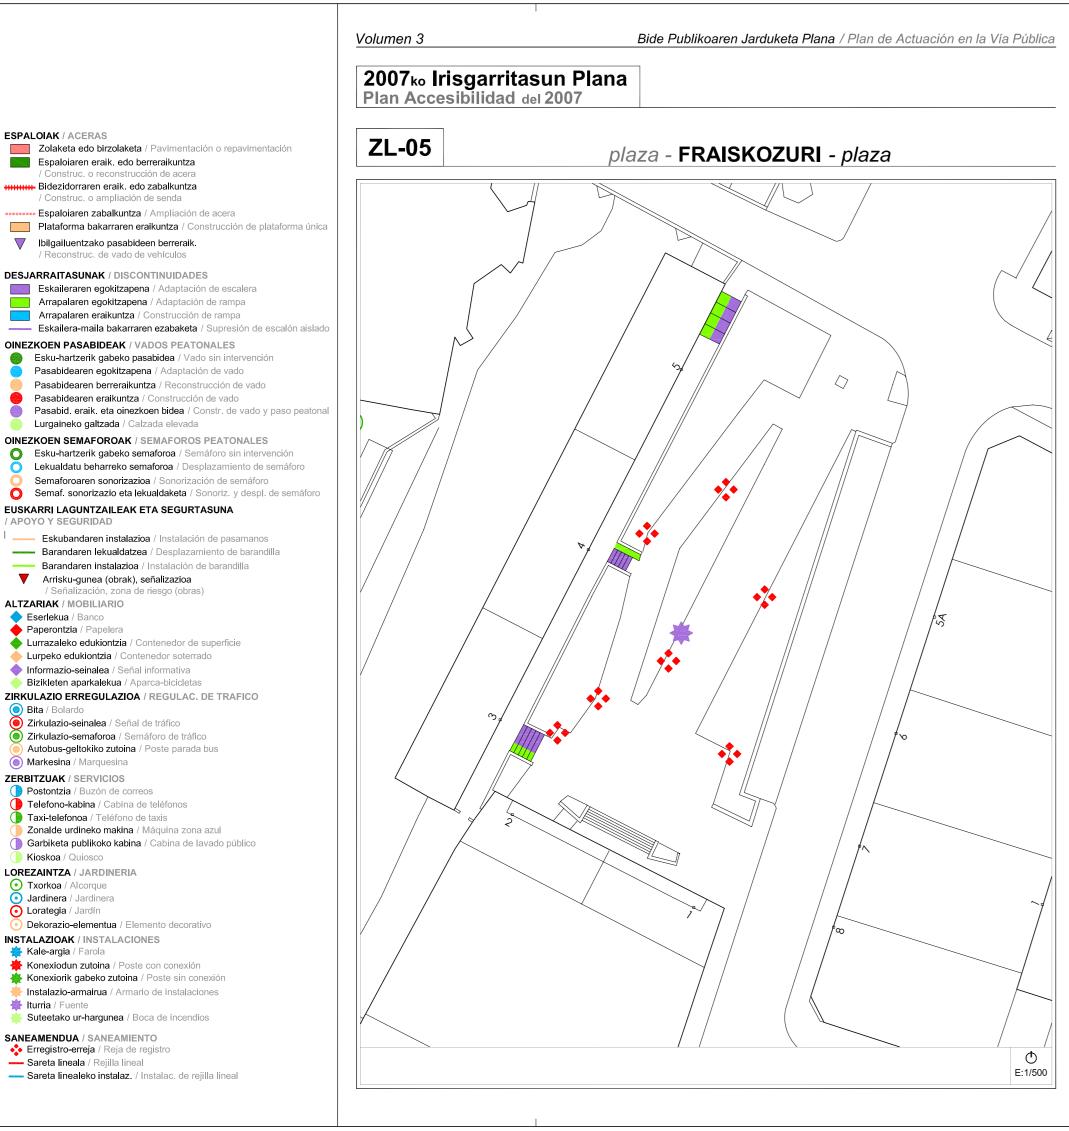

/ APOYO Y SEGURIDAD

ALTZARIAK / MOBILIARIO Eserlekua / Banco Paperontzia / Papelera

Bita / Bolardo

Markesina / Marquesina ZERBITZUAK / SERVICIOS Postontzia / Buzón de correos Telefono-kabina / Cabina de teléfonos Taxi-telefonoa / Teléfono de taxis

Kioskoa / Quiosco LOREZAINTZA / JARDINERIA Txorkoa / Alcorque Jardinera / Jardinera Lorategia / Jardín

🕌 Iturria / Fuente

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES 🜞 Kale-argia / Farola

SANEAMENDUA / SANEAMIENTO Erregistro-erreja / Reja de registro

Sareta lineala / Rejilla lineal


Arrisku-gunea (obrak), señalizazioa

Informazio-seinalea / Señal informativa

Zirkulazio-seinalea / Señal de tráfico

/ Construc. o ampliación de senda

Reconstruc. de vado de vehículos

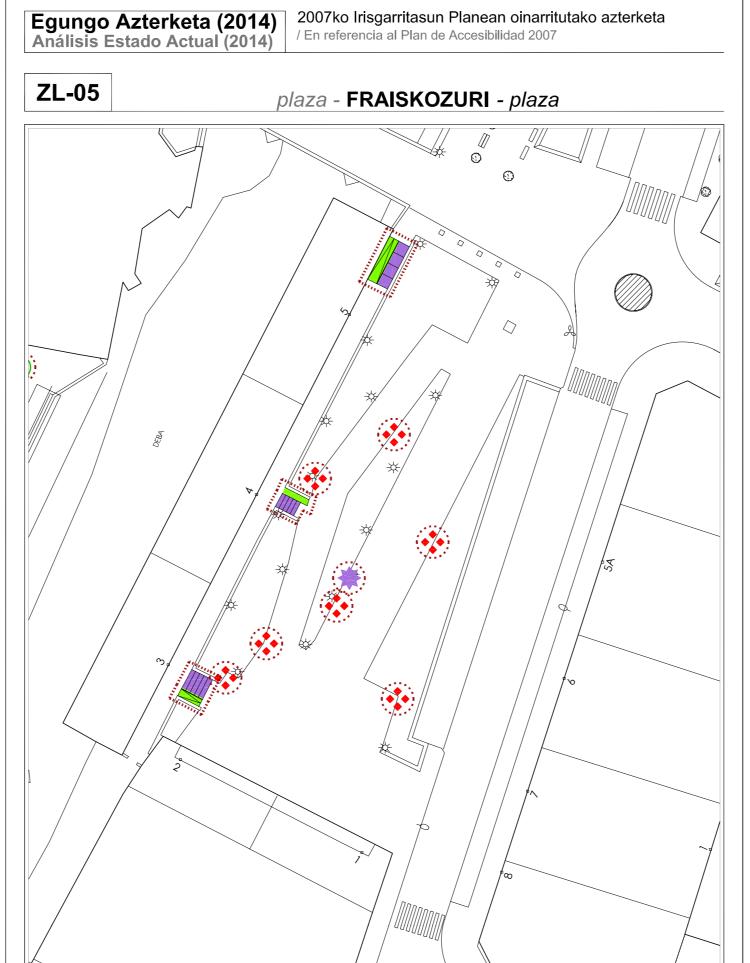

Exekutaturiko urbanizazio berria / Nueva

E:1/500

Exekutatze prozesuan / En ejecucion


Urbanizazio berria / Nueva urbanización

Konpondu gabeko gabezia / Deficiencia no solucionada


Konpondutako gabezia / Deficencia solucionada

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Volumen 3





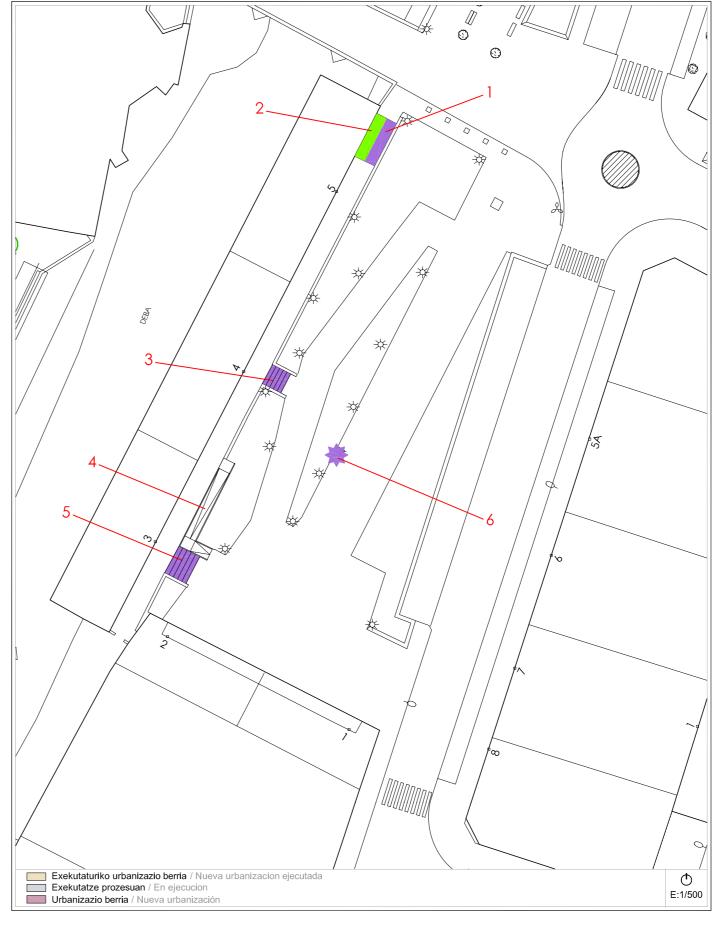

Volumen 3 Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

ZL-05

plaza - FRAISKOZURI - plaza

Plano	Intervención	Uds	Subtotal
1	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	16	1.789,48€
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	4	290,83€
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	3	167,76€
2	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	3	167,76 €
3	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	8	894,74 €
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	6	436,24€
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	4	223,69€
	Reconstrucción de escaleras.	3,5	803,50€
4	Construcción de rampa de pendiente máxima del 8%, pavimento antideslizante y pasamanos en ambos costados en m2.	26	7.270,12 €
5	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	10	1.118,43 €
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	8	581,66€
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	6	335,52€
	Reconstrucción de escaleras.	3,5	803,50€
7	Suministro y colocación de fuente adaptada.	1	2.236,88 €
	Presupuesto de Ejecucio	ón Material	17.120,11 €

ZL-06

plaza - S. ARRIETA - plaza

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación





Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta

Se propone la adaptación de los accesos sitos en la c/ Irizar por medio de franjas señalizadoras, pasamanos y bandas rugosas, por estar compuestos por tramos de escaleras y rampa.

También se propone la adaptación de escaleras que dan acceso desde la calle Kruz Gallastegi. Desde dicha calle tambíen se puede acceder a la plaza sin ningún tipo de problema.


En su recorrido interior, se observa la necesidad de sustituir parte de su mobiliario urbano, debido a su incorrecto diseño, como son bancos y fuente.

Respecto al Plan de Accesibilidad del 2007, no se ha ejecutado ninguna intervención propuesta en dicho Plan, por lo que se mantienen todas las intervenciones propuestas, exceptuando la sustitución de alcorques y sumideros por tratarse de modelos normalizados.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds, mts, mts2)

Banco	2
Escalera	4
Fuente	1
Rampa	1

Comunicación	5.374,46 €
Pasamanos	2.907,89€
Sustitución mobiliario urbano	3.355,35 €
PRESUPUESTO TOTAL	11.637,70€

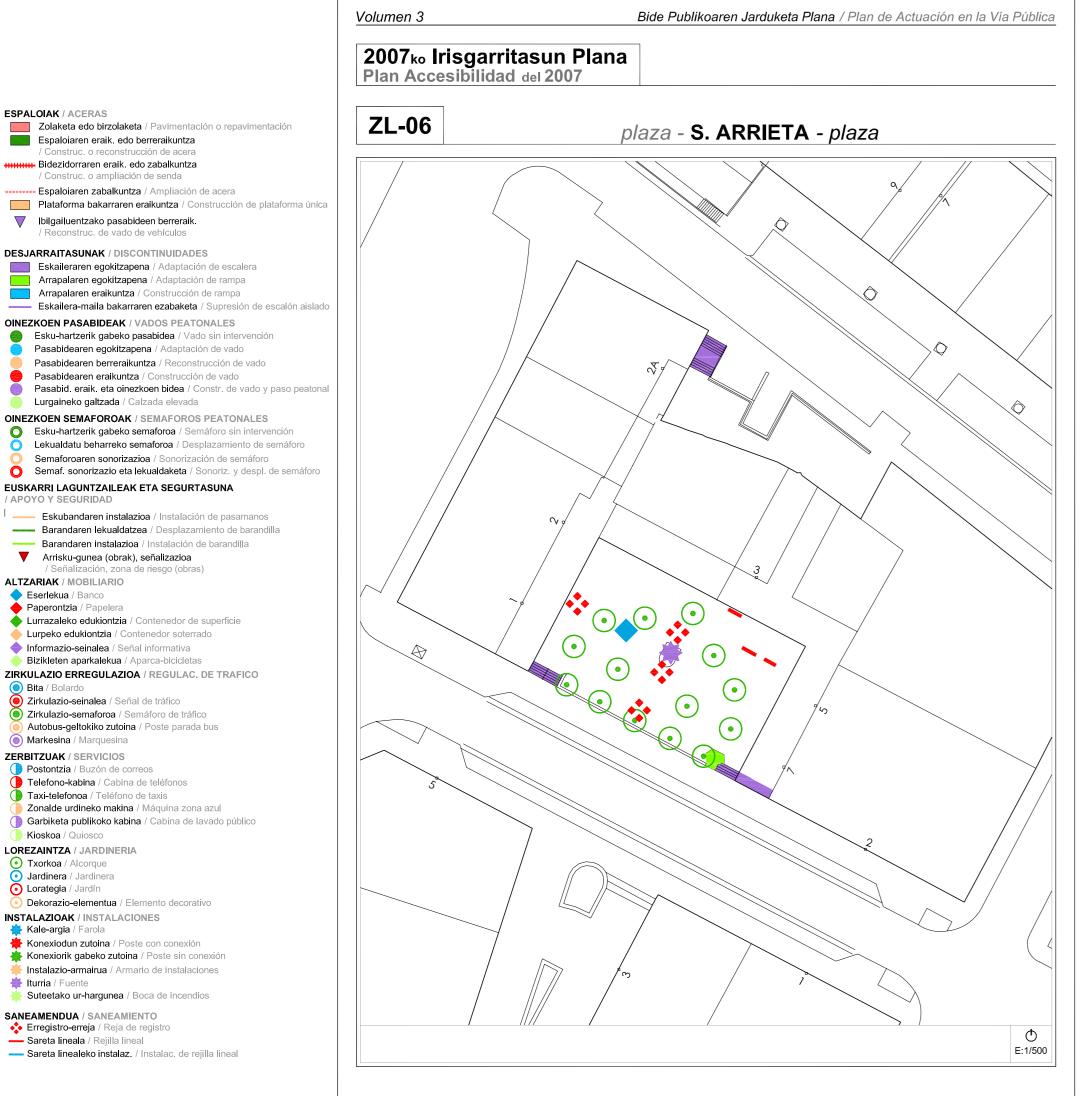

Espaloiaren eraik. edo berreraikuntza HIHHHH- Bidezidorraren eraik. edo zabalkuntza / Construc, o ampliación de senda Espaloiaren zabalkuntza / Ampliación de acera

Ibilgailuentzako pasabideen berreraik. Reconstruc. de vado de vehículos **DESJARRAITASUNAK / DISCONTINUIDADES**

Arrapalaren egokitzapena / Adaptación de rampa Arrapalaren eraikuntza / Construcción de rampa

Pasabidearen eraikuntza / Construcción de vado

OINEZKOEN PASABIDEAK / VADOS PEATONALES

Lurgaineko galtzada / Calzada elevada

EUSKARRI LAGUNTZAILEAK ETA SEGURTASUNA

Lurrazaleko edukiontzia / Contenedor de superficie Lurpeko edukiontzia / Contenedor soterrado Informazio-seinalea / Señal informativa Bizikleten aparkalekua / Aparca-bicicletas

Zonalde urdineko makina / Máquina zona azul

Dekorazio-elementua / Elemento decorativo

Konexiodun zutoina / Poste con conexión Konexiorik gabeko zutoina / Poste sin conexión instalazio-armairua / Armario de instalaciones

Suteetako ur-hargunea / Boca de incendios

Sareta linealeko instalaz. / Instalac. de rejilla lineal

Arrisku-gunea (obrak), señalizazioa

Zirkulazio-seinalea / Señal de tráfico Zirkulazio-semaforoa / Semáforo de tráfico) Autobus-geltokiko zutoina / Poste parada bus

Markesina / Marquesina ZERBITZUAK / SERVICIOS Postontzia / Buzón de correos Telefono-kabina / Cabina de teléfonos Taxi-telefonoa / Teléfono de taxis

Kioskoa / Quiosco LOREZAINTZA / JARDINERIA Txorkoa / Alcorque Jardinera / Jardinera Lorategia / Jardín

Iturria / Fuente

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES Kale-argia / Farola

SANEAMENDUA / SANEAMIENTO Erregistro-erreja / Reja de registro

- Sareta lineala / Rejilla lineal

/ APOYO Y SEGURIDAD

ALTZARIAK / MOBILIARIO Eserlekua / Banco Paperontzia / Papelera

Bita / Bolardo

Volumen 3 Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública 2007ko Irisgarritasun Planean oinarritutako azterketa Egungo Azterketa (2014) / En referencia al Plan de Accesibilidad 2007 Análisis Estado Actual (2014) **ZL-06**

plaza - S. ARRIETA - plaza Exekutaturiko urbanizazio berria / Nue 🌣 Konpondu gabeko gabezia / Deficiencia no solucionada

Exekutatze prozesuan / En ejecucion

Urbanizazio berria / Nueva urbanización


E:1/500

Konpondutako gabezia / Deficencia solucionada

Proposamena (2014) Propuesta (2014) Dokumentazio grafikoa / Documentación gráfica

ZL-06 plaza - S. ARRIETA - plaza

Volumen 3

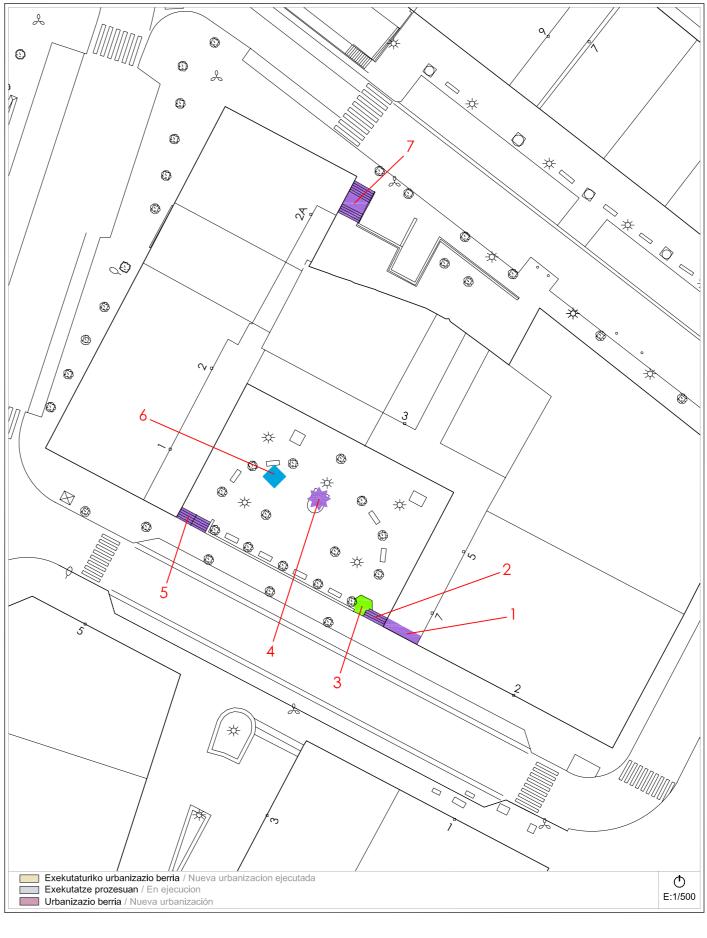

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública Volumen 3 Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

ZL-06


plaza - S. ARRIETA - plaza

Plano	Intervención	Uds	Subtota
1	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	5	559,21
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	12	872,49
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	10	559,21
2	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	4	447,37
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	6	436,24
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	6	335,52
3	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	4	223,69
4	Suministro y colocación de fuente adaptada.	1	2.236,88
5	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	7	782,89
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	13	945,19
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	9	503,29
6	Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.	2	1.118,46
7	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	10	1.118,43
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	16	1.163,31
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	6	335,52
	Presupuesto de Ejecu	ıción Material	11.637,70

ZL-07

plaza - OSTETA - plaza

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación

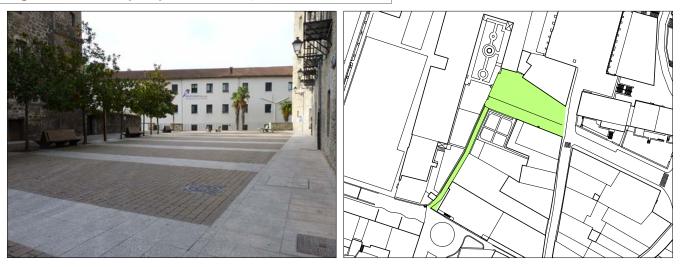

Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta

Esta zona libre no presenta problemas de accesibilidad, ni en sus accesos, ni en su recorrido interior.

Respecto al Plan de Accesibilidad del 2007, únicamentente se ha ejecutado la protección de la zona de riesgo mediante barandillas situado en la fachada lateral de Bidekurutzeta nº6. Por otra parte, se han eliminado las intervenciones que hacían referencia a la sustitución de alcorques y bancos; por lo que esta plaza cumple con la normativa de accesibilidad.




ZL-08

plaza - OSINTXU - plaza

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación





Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta


Se propone la adaptación de la escalera de acceso a la plaza con la instalación de pasamanos, bandas rugosas en escalones y franjas señalizadoras; y en su interior se deben sustituir las rejillas.

Respecto al Plan de Accesibilidad del 2007, al eliminar los árboles que había en la plaza se anula la intervención de instalación de alcorques. Las demás intervenciones no se han ejecutado, por lo que se mantienen todas las intervenciones propuestas.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds, mts, mts2)

Banco	1
Escalera	1
Reja o registro	6

Comunicación	1.509,96 €
Pasamanos	447,37€
Sustitución mobiliario urbano	961,86€
PRESUPUESTO TOTAL	2.919,19€

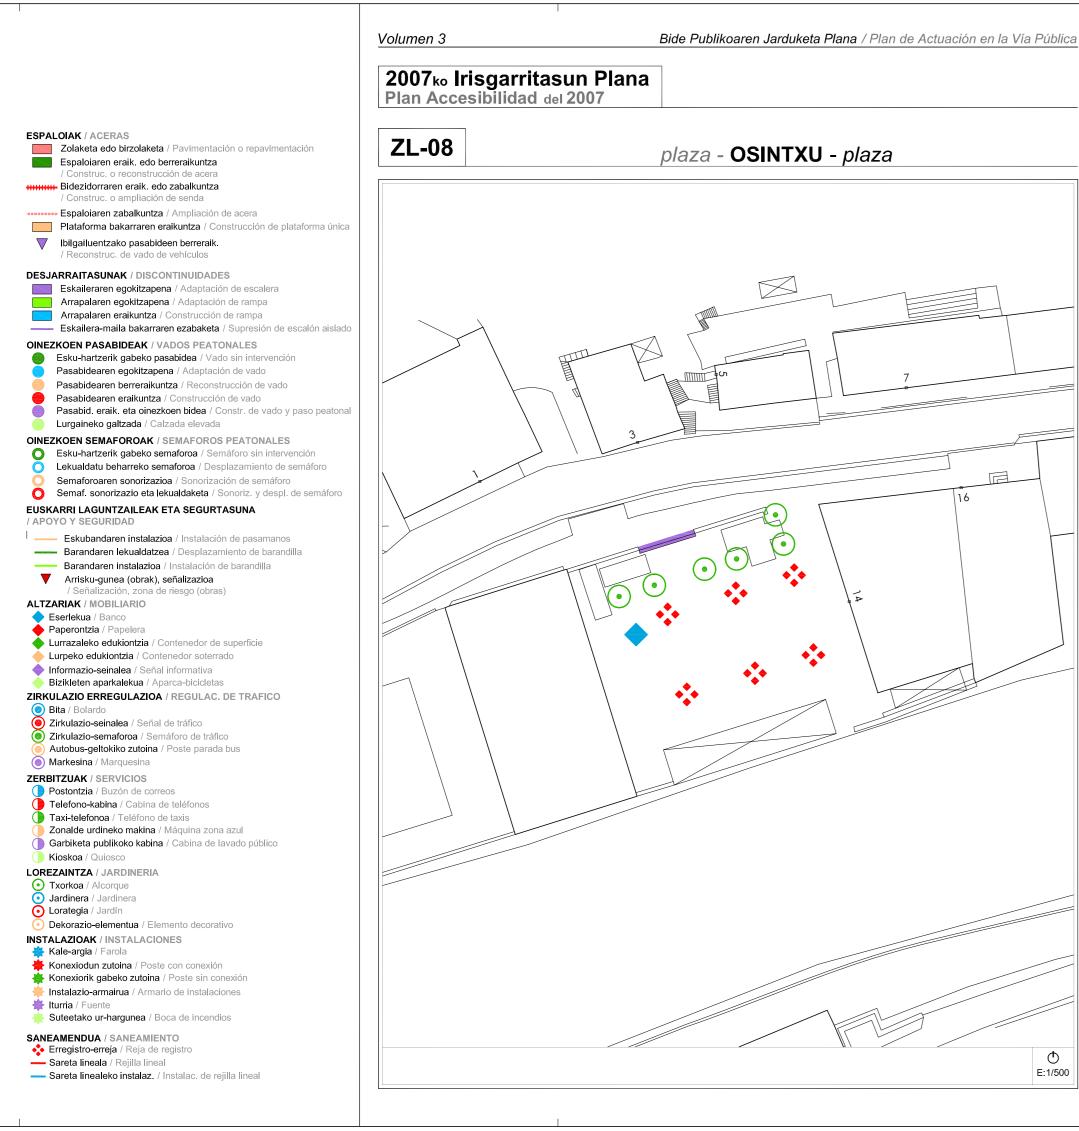


Egungo Azterketa (2014)
Análisis Estado Actual (2014)

ZL-08

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

2007ko Irisgarritasun Planean oinarritutako azterketa
/ En referencia al Plan de Accesibilidad 2007

plaza - OSINTXU - plaza

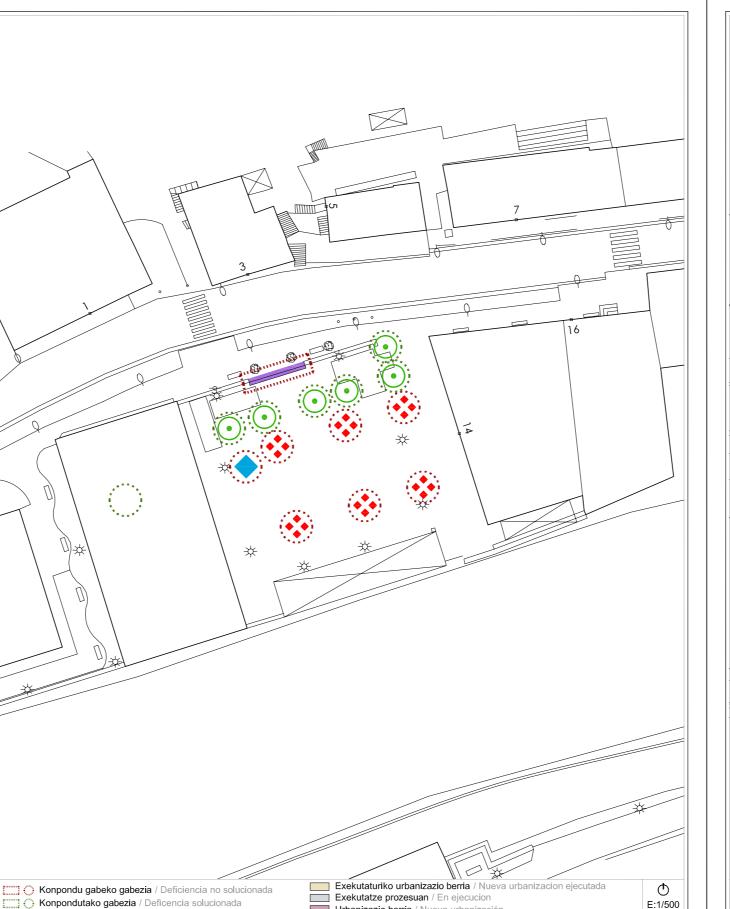

Urbanizazio berria / Nueva urbanización


Volumen 3

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014)

Proposamena (2014)
Propuesta (2014)
Dokumentazio grafikoa / Documentación gráfica

ZL-08 plaza - OSINTXU - plaza

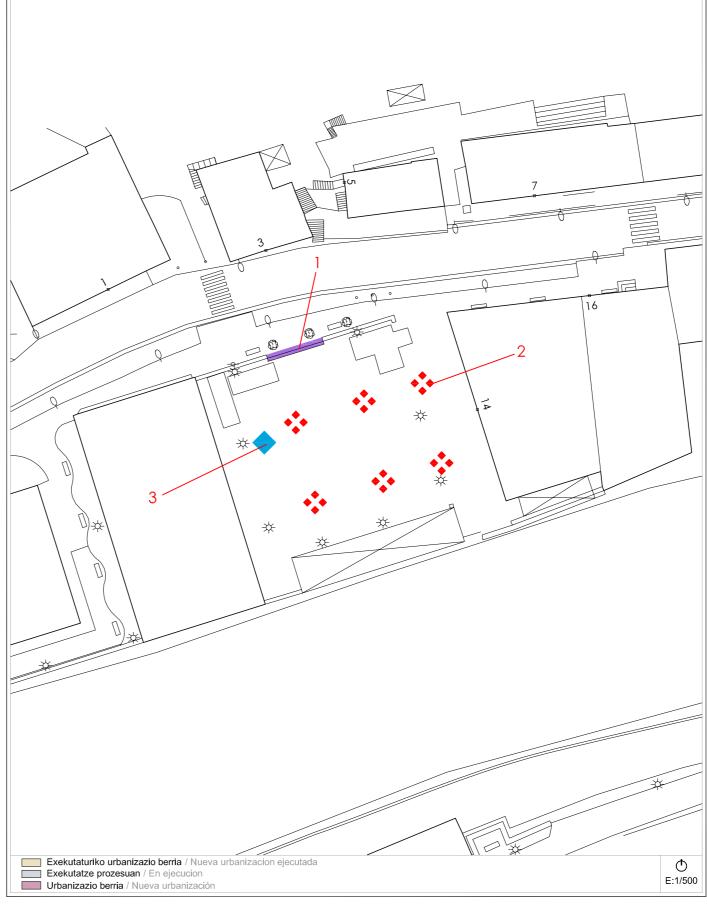

Volumen 3

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

ZL-08

plaza - OSINTXU - plaza


Plano	Intervención	Uds	Subtotal
1	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	4	447,37 €
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	10	727,07€
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	14	782,89€
2	Suministro y colocación de ud. de reja o registro.	6	402,63€
3	Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.	1	559,23€
	Presupuesto de Ejecu	ıción Material	2.919,19€

ZL-09a/b

barrio - ANGIOZAR - auzoa

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación





Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta

Se trata de un barrio rural que se ha ido desarrollando urbanísticamente pero que sigue manteniendo en gran parte su traza anterior. Las fuertes pendientes de los antiguos caminos hace prácticamente imposible cumplimentar las normativas vigentes de accesibilidad.

Presenta todo su recorrido como plataforma mixta, donde conviven peatones y vehículos. Se han encontrado tramos cuya pendiente supera el 6%, máximo permitido por la Ley de Accesibilidad, y en parte de estos tramos se proponen la colocación de pasamanos para facilitar el caminar del viandante.


También se han observado varios tramos de escaleras, los cuales adaptaremos y por último hacer referencia al apartado de mobiliario urbano donde se propone la sustitución de rejillas lineales debido a su diseño inadecuado.


Respecto al Plan de Accesibilidad del 2007, únicamente se han sustituido algunas rejillas, y se suprime en el presente Plan parte de la instalación de pasamanos porque dificultaría el acceso a algunos puntos del barrio si se mantienen en las nuevas urbanizaciones de carácter más urbano.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds, mts, mts2)

Escalera	24
Pendiente > 6%	87
Rejilla lineal	41

Comunicación	7.192,23€
Pasamanos	13.421,10€
Sustitución mobiliario urbano	7.336,83 €
PRESUPUESTO TOTAL	27.950,16 €

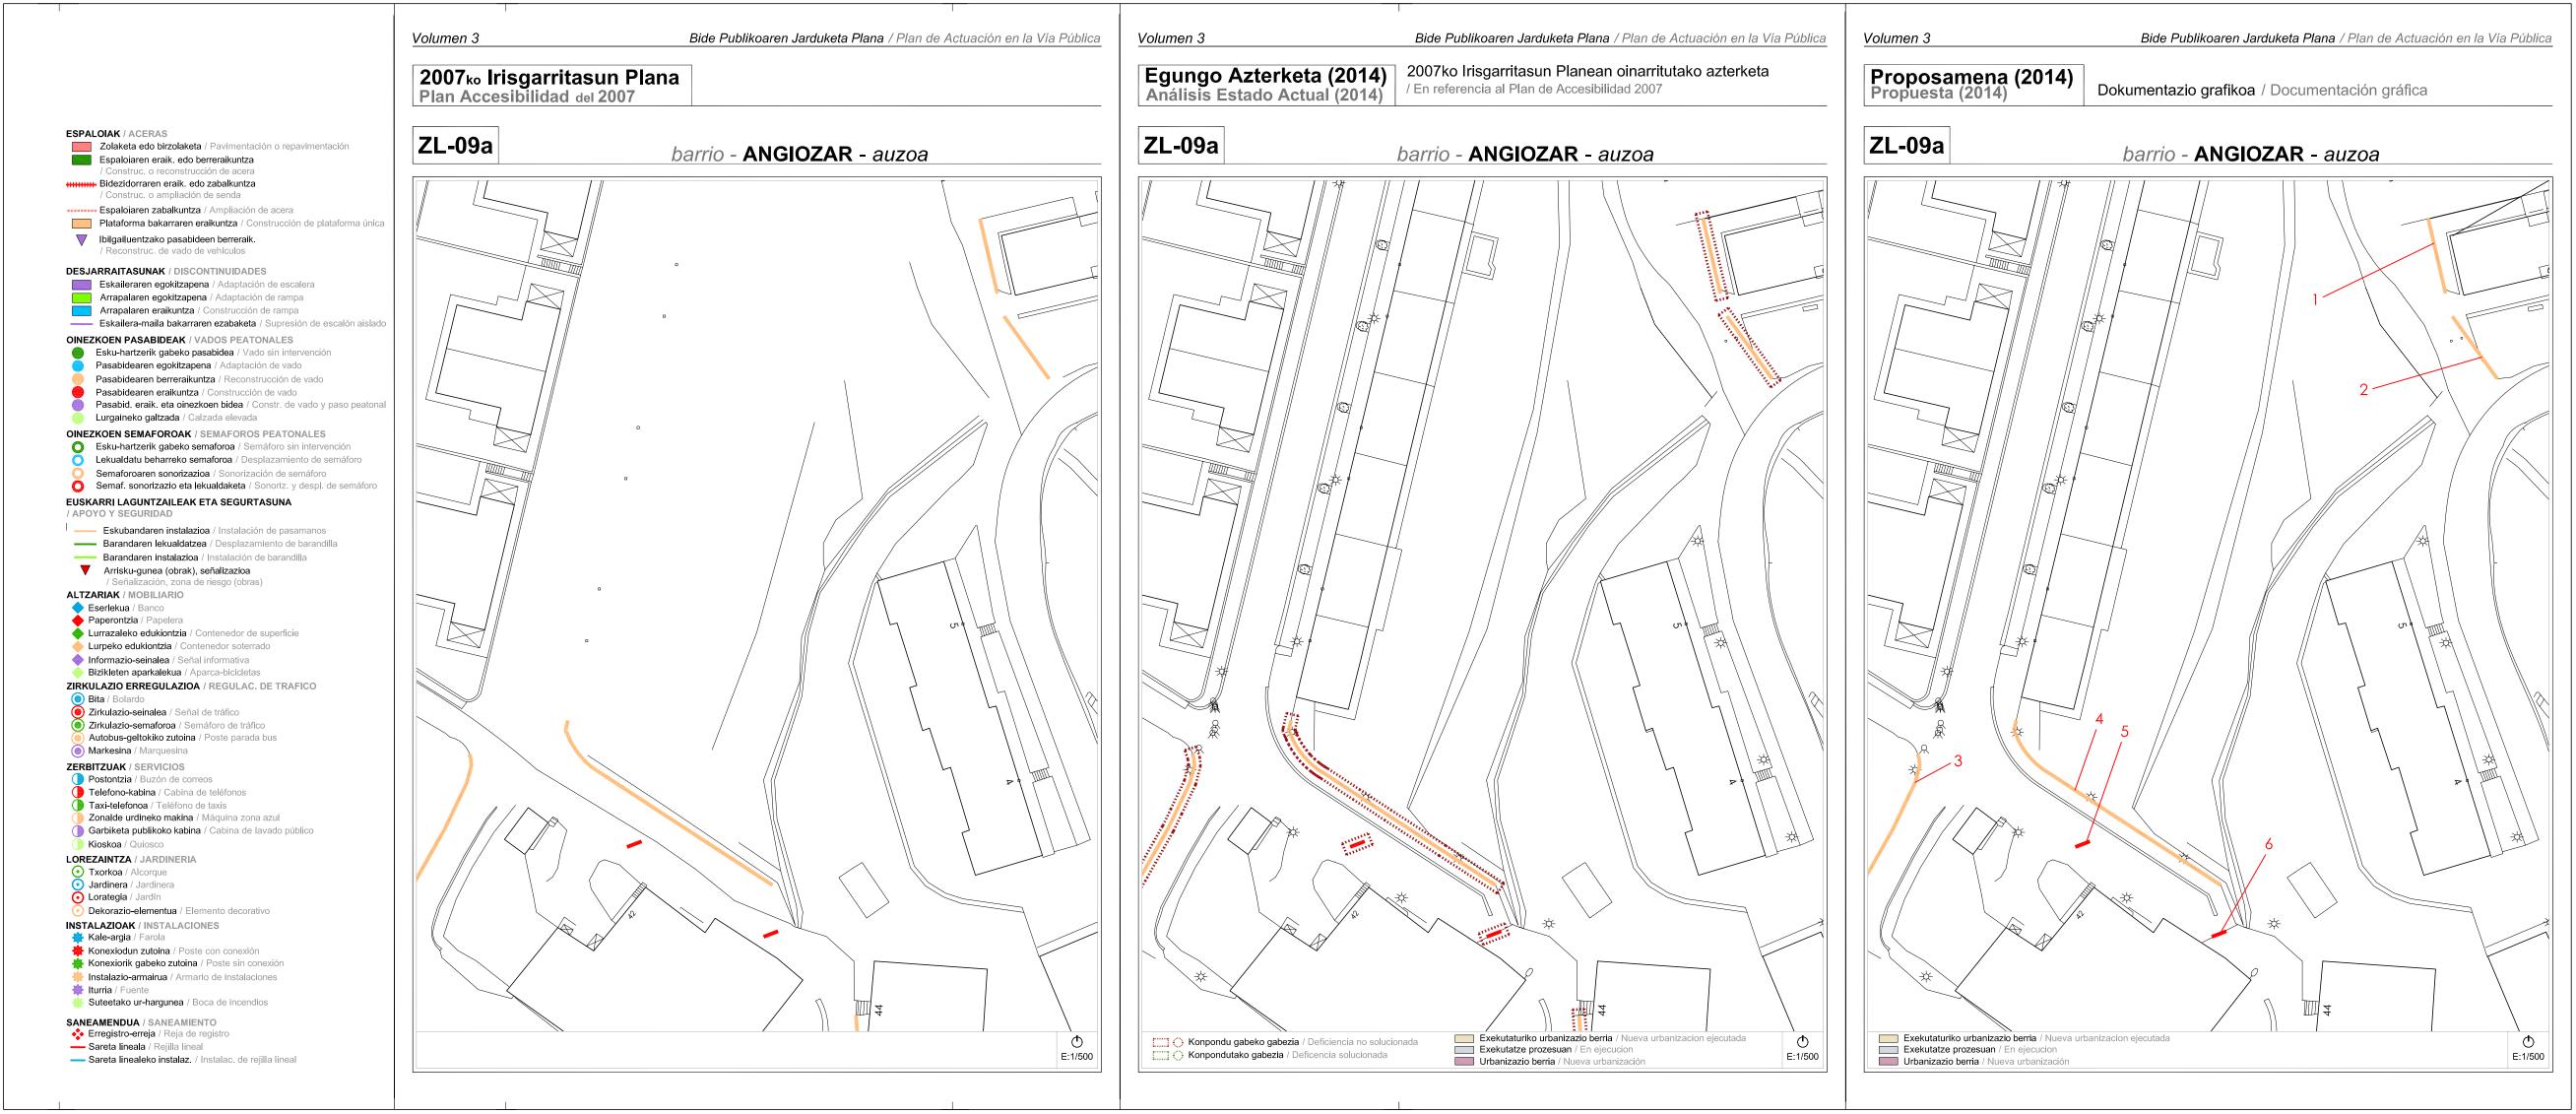

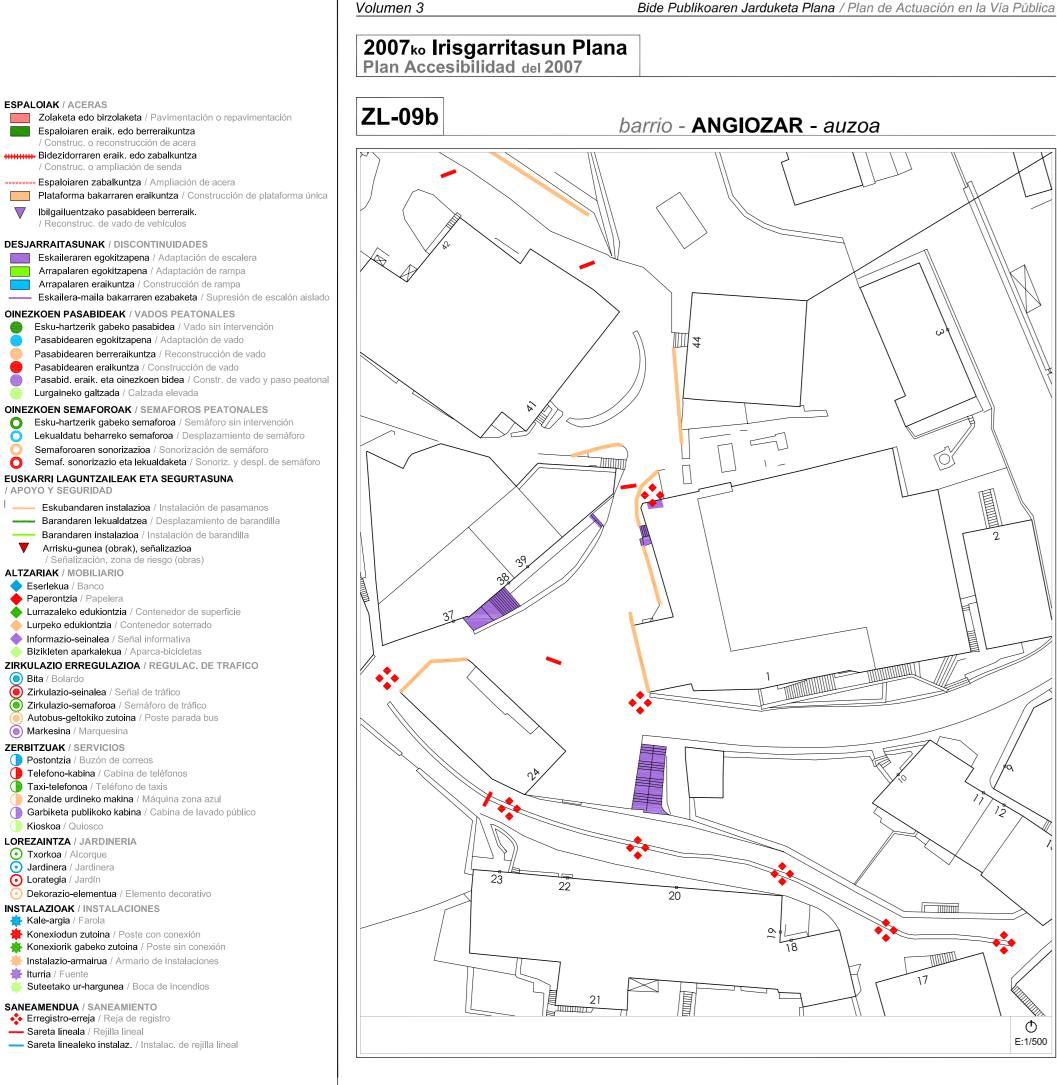

Espaloiaren eraik. edo berreraikuntza HIHHHH- Bidezidorraren eraik. edo zabalkuntza / Construc, o ampliación de senda

Ibilgailuentzako pasabideen berreraik. Reconstruc. de vado de vehículos

Lurgaineko galtzada / Calzada elevada

Arrisku-gunea (obrak), señalizazioa

Informazio-seinalea / Señal informativa Bizikleten aparkalekua / Aparca-bicicletas

Zirkulazio-seinalea / Señal de tráfico

Markesina / Marquesina ZERBITZUAK / SERVICIOS Postontzia / Buzón de correos Telefono-kabina / Cabina de teléfonos Taxi-telefonoa / Teléfono de taxis

Kioskoa / Quiosco LOREZAINTZA / JARDINERIA Txorkoa / Alcorque Jardinera / Jardinera Lorategia / Jardín

🜞 Kale-argia / Farola

Iturria / Fuente

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES

SANEAMENDUA / SANEAMIENTO Erregistro-erreja / Reja de registro

- Sareta lineala / Rejilla lineal

Konexiodun zutoina / Poste con conexión

/ APOYO Y SEGURIDAD

ALTZARIAK / MOBILIARIO Eserlekua / Banco Paperontzia / Papelera

Bita / Bolardo

ZL-09b barrio - ANGIOZAR - auzoa barrio - ANGIOZAR - auzoa Exekutaturiko urbanizazio berria / 1 Nonpondu gabeko gabezia / Deficiencia no solucionada Exekutatze prozesuan / En ejecucion Konpondutako gabezia / Deficencia solucionada E:1/500 Urbanizazio berria / Nueva urbanización

Volumen 3

Egungo Azterketa (2014)

Análisis Estado Actual (2014)

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

2007ko Irisgarritasun Planean oinarritutako azterketa


/ En referencia al Plan de Accesibilidad 2007

Volumen 3

E:1/500

Proposamena (2014) Propuesta (2014) Dokumentazio grafikoa / Documentación gráfica

ZL-09b barrio - ANGIOZAR - auzoa

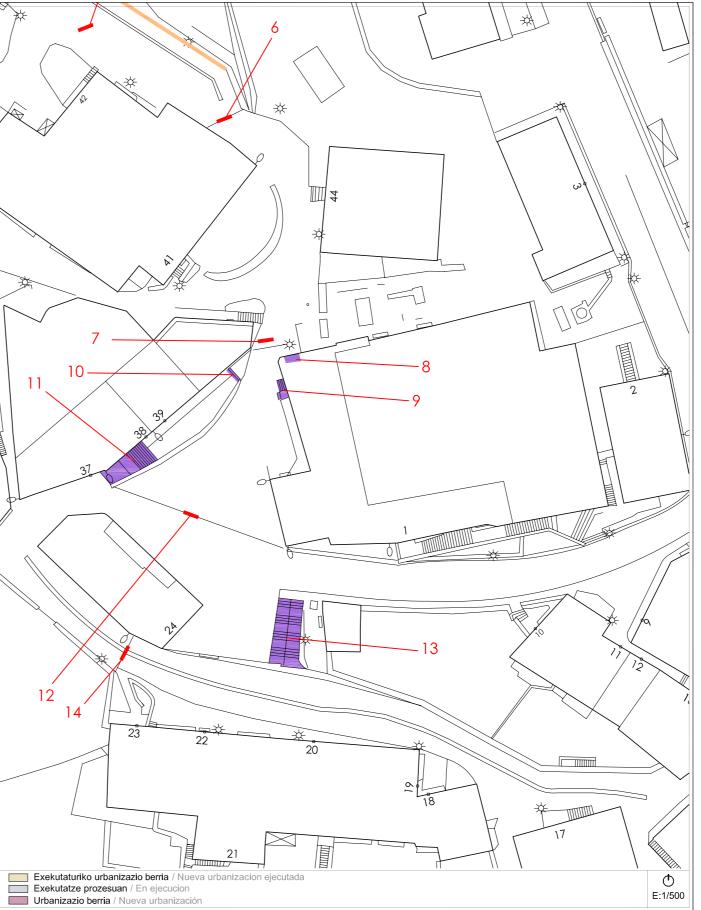

Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública Volumen 3 Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

ZL-09a/b


barrio - ANGIOZAR - auzoa

Plano	Intervención	Uds	Subtota
1	Suministro y colocación de pasamanos.	10	1.118,43
2	Suministro y colocación de pasamanos.	10	1.118,43
3	Suministro y colocación de pasamanos.	23	2.572,37
4	Suministro y colocación de pasamanos.	44	4.921,06
5	Sustitución de rejilla lineal.	5	894,74
6	Sustitución de rejilla lineal.	5	894,74
7	Sustitución de rejilla lineal.	4	715,79
8	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	2	223,69
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	2	145,41
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	2	111,84
9	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	5	559,21
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	8	581,66
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	4	223,69
10	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	2	223,69
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	2	145,41
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	2	111,84
11	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	13	1.453,95
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	34	2.472,03
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	6	335,52
12	Sustitución de rejilla lineal.	24	4.294,74
13	Suministro y colocación de pasamanos en escalera o rampa.	11	1.230,26
	Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones.	36	2.617,45
	Instalación de franja señalizadora de pavimento táctil.	8	447,37
14	Sustitución de rejilla lineal.	3	536,84
	Presunuesto de	Ejecución Material	27.950,16

ZL-10

jardines - IRIZAR - lorategiak

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación

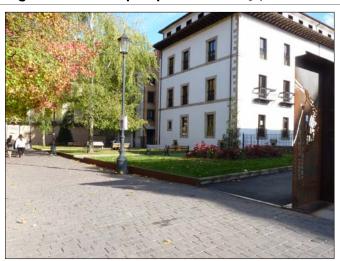



Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta

Se propone únicamente la colocación de una fuente adaptada y el cambio de rejas o registros existentes, ya que la zona libre no presenta problemas de accesibilidad, ni en sus accesos, ni en su recorrido interior.

Por lo tanto, respecto al Plan de Accesibilidad del 2007, únicamentente se mantienen las propuestas de intervención mencionados anteriormente.

Aurkitutako elementuak / Elementos encontrados (uds, mts, mts2)

Fuente	1
Reja o registro	2

Sustitución mobiliario urbano	2.371,09€
PRESUPUESTO TOTAL	2.371,09€



Espaloiaren eraik. edo berreraikuntza HIHHHH- Bidezidorraren eraik. edo zabalkuntza / Construc, o ampliación de senda Espaloiaren zabalkuntza / Ampliación de acera

Ibilgailuentzako pasabideen berreraik. Reconstruc. de vado de vehículos DESJARRAITASUNAK / DISCONTINUIDADES

Eskaileraren egokitzapena / Adaptación de escalera Arrapalaren egokitzapena / Adaptación de rampa Arrapalaren eraikuntza / Construcción de rampa

OINEZKOEN PASABIDEAK / VADOS PEATONALES Esku-hartzerik gabeko pasabidea / Vado sin intervención Pasabidearen egokitzapena / Adaptación de vado Pasabidearen berreraikuntza / Reconstrucción de vado Pasabidearen eraikuntza / Construcción de vado

Lurgaineko galtzada / Calzada elevada

EUSKARRI LAGUNTZAILEAK ETA SEGURTASUNA

Arrisku-gunea (obrak), señalizazioa

Zirkulazio-seinalea / Señal de tráfico Zirkulazio-semaforoa / Semáforo de tráfico Autobus-geltokiko zutoina / Poste parada bus

/ APOYO Y SEGURIDAD

ALTZARIAK / MOBILIARIO Eserlekua / Banco Paperontzia / Papelera

Bita / Bolardo

Markesina / Marquesina ZERBITZUAK / SERVICIOS Postontzia / Buzón de correos Telefono-kabina / Cabina de teléfonos Taxi-telefonoa / Teléfono de taxis

Kioskoa / Quiosco LOREZAINTZA / JARDINERIA Txorkoa / Alcorque Jardinera / Jardinera Lorategia / Jardín

Iturria / Fuente

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES 🜞 Kale-argia / Farola

SANEAMENDUA / SANEAMIENTO Erregistro-erreja / Reja de registro

- Sareta lineala / Rejilla lineal

OINEZKOEN SEMAFOROAK / SEMAFOROS PEATONALES

Eskubandaren instalazioa / Instalación de pasamanos

Barandaren instalazioa / Instalación de barandilla

Lurrazaleko edukiontzia / Contenedor de superficie Lurpeko edukiontzia / Contenedor soterrado Informazio-seinalea / Señal informativa Bizikleten aparkalekua / Aparca-bicicletas

ZIRKULAZIO ERREGULAZIOA / REGULAC. DE TRAFICO

Zonalde urdineko makina / Máquina zona azul Garbiketa publikoko kabina / Cabina de lavado público

Dekorazio-elementua / Elemento decorativo

Konexiodun zutoina / Poste con conexión Konexiorik gabeko zutoina / Poste sin conexión instalazio-armairua / Armario de instalaciones

Suteetako ur-hargunea / Boca de incendios

Sareta linealeko instalaz. / Instalac. de rejilla lineal

Semaforoaren sonorizazioa / Sonorización de semáforo

Volumen 3 Bide Publikoaren Jarduketa Plana / Plan de Actuación en la Vía Pública

Proposamena (2014) Propuesta (2014)

Aurrekontua / Presupuesto

ZL-10

jardines - IRIZAR - lorategiak

ano	Intervención	Ud	ls	Subtotal
1	Suministro e instalación de fuente adaptada.	1		2.236,88 €
2	Suministro y colocación de ud. de reja o registro.	2		134,21 €
		Presupuesto de Ejecución Mate	rial	2.371,09€

ZL-11


parque - ERROTALDE - parkea

Argazkia eta kokapen planoa / Foto y plano de ubicación



Deskribapena eta proposamena / Descripción y propuesta

Esta zona libre no presenta problemas de accesibilidad, ni en sus accesos, ni en su recorrido interior,ya que se han ejecutado las intervenciones propuestas en el Plan de Accesibilidad del 2007, que eran la pavimentación del recorrido y sustitución de bancos por unos adaptables.

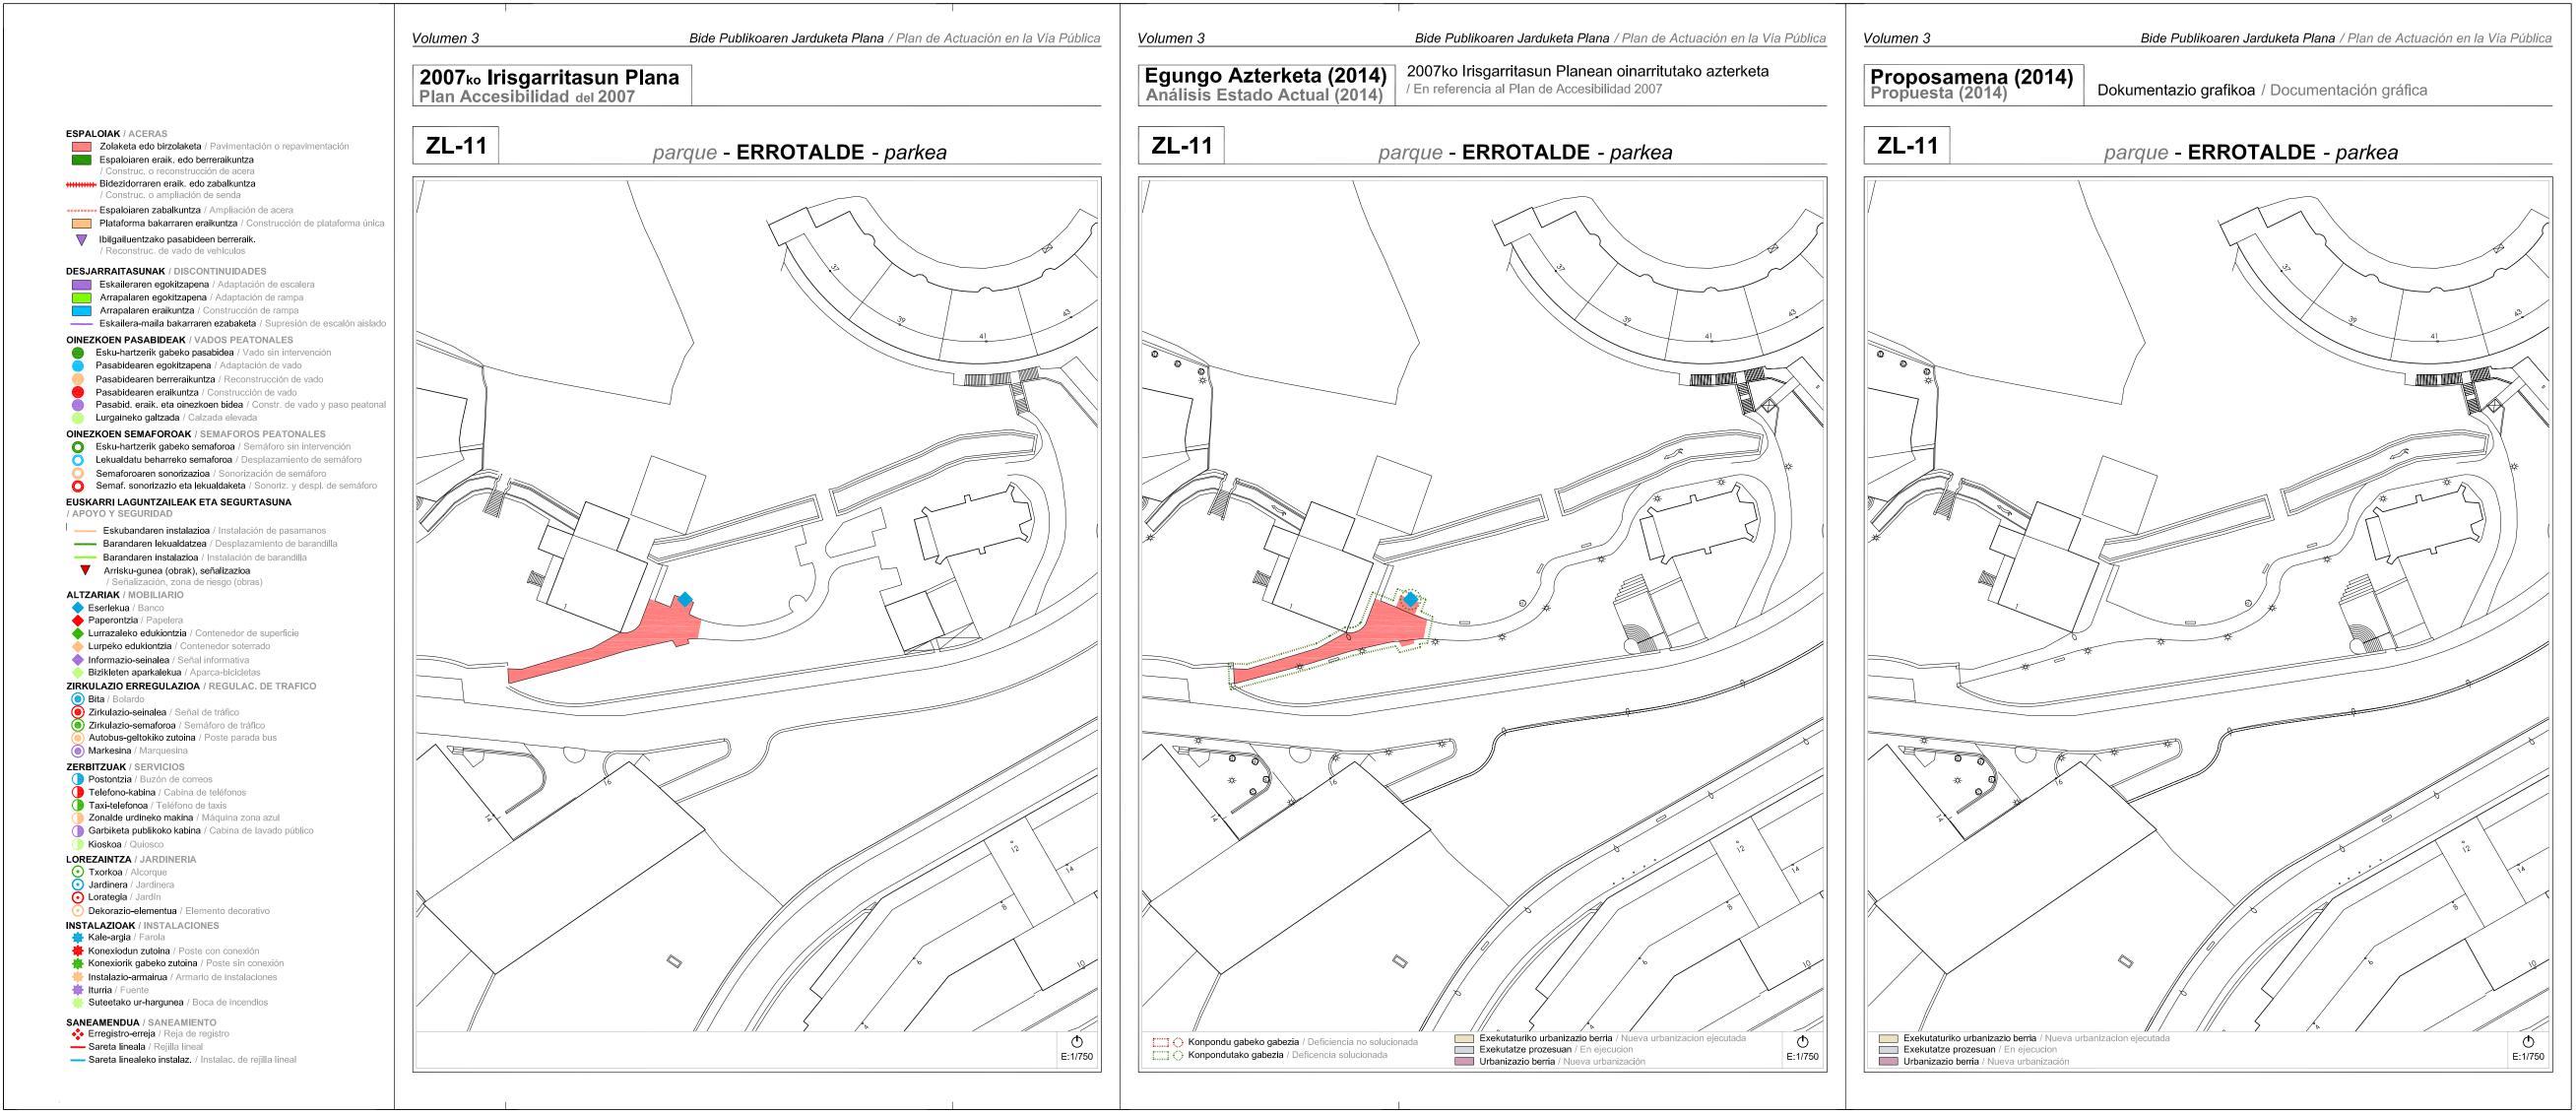

-to-6-

En Donostia – San Sebastián, diciembre de 2014.

Los arquitectos:

Javier Yeregui

Luis P. Blanco

W.C. Izaskun Salaberria

Eneko Bereau
